

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

LICITACIÓN PÚBLICA 03-01-26

**“Obra: Ampliación de redes de agua y cloaca en diferentes
calles FOS 2025 - 2026”**

Monto oficial: \$225.868.850,¹⁴

Fecha de Apertura: la determinada por el decreto que autoriza al
presente llamado

Lugar de Apertura: Dirección de Compras y Suministros

Valor del Pliego: SIN COSTO

Plazo de ejecución: 120 días corridos

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

MEMORIA DESCRIPTIVA

Siguiendo con el plan de saneamiento del Municipio de Tandil y con la implementación del FOS (Fondo Obras Sanitarias), se ha resuelto la ejecución de la extensión de la red colectora cloacal y distribución de agua en diversos sectores de la ciudad.

El contratista que resulte adjudicado deberá proveer las herramientas, la mano de obra y algunos materiales menores que se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas, mientras que el Municipio proveerá en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales ubicada en Dinamarca y Bereterbide de la Dirección General de Obras Sanitarias Tandil los caños con aros de goma, las bocas de registro de polietileno y los marcos y tapas de hierro fundido o fundición dúctil. La Inspección de la obra se realizará a través de la Gerencia Técnica de esa Dirección. Antes de comenzar un sector o cuadra el contratista deberá obtener las interferencias de otros servicios que pudieran existir y solo podrá iniciar el zanjeo una vez identificadas las mismas al menos en tres puntos de la cuadra. El número de cateos se intensificará si se detectara la existencia de servicios que no siguen una línea paralela a la línea municipal.

La obra se realiza en su totalidad en la vía pública y totalmente a cielo abierta, aún en los cruces de calle, y con tapadas y pendientes que permitan el desagüe a gravedad de las viviendas con frente a la cañería a construir. Se utilizarán para tal fin cañerías de PVC Unión Deslizante (UD) con aro de goma. Los diámetros serán los indicados en plano. En coincidencia con las esquinas y con una distancia no mayor de 145 metros se ejecutarán bocas de registro, en los lugares indicados en plano. Estas serán de polietileno o PRFV convenientemente asentadas con material granular fino (piedra 0-6), con losa de tapa en hormigón armado y marco y tapa de hierro fundido o fundición dúctil, como elemento de cierre y acceso.

Las cañerías serán probadas a través de prueba hidráulica tanto en cañerías destinadas a provisión de agua como de cloacas.

Los empalmes a la red de agua serán realizados por la empresa contratista con la supervisión de Gerencia Operativa de agua, una vez realizada la prueba hidráulica en un plazo no mayor a 15 días corridos.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

Se prevé la ejecución de 1170.65 metros lineales de red de cloacas y 2172.95 metros lineales de red de agua.

La obra será por unidad de medida y el plazo de ejecución será de 120 días corridos.

El presupuesto oficial es de \$225.868.850,¹⁴. Doscientos veinticinco millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta con catorce cv (en letras)

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ARTICULO 1.- NORMAS GENERALES: La presente obra se regirá por las Especificaciones Técnicas Generales de la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (AGOSBA), Cuadernillos "Aa - Especificaciones Técnicas Generales para Servicio de Agua Corriente" (Actualizado a abril de 1974), "B - Especificaciones Técnicas Generales para Servicio Cloacal" (Actualizado a Octubre de 1977), "C - Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles" (Actualizado a abril de 1974) y de "Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Trabajos en Obras de Hormigón" y las "Normas Generales para la Ejecución de Obras por Cuenta de Terceros" de OSN.

Esta documentación podrá ser consultada en la Gerencia Técnica de la Dirección General de Obras Sanitarias de Tandil de la Municipalidad de Tandil, Avda. del Valle 1590, Tandil, y a los efectos legales debe considerarse formando parte del Pliego que regirá la presente Licitación.

Asimismo, se considerarán integrando estas Especificaciones Técnicas Generales, las Reglamentaciones del CIRSOC para estructuras de Hormigón Armado.

ARTICULO 2°.- PERSONAL TECNICO: Se requerirá la presencia de un Representante Técnico con Título Universitario de Ingeniero, que deberá presentar su contrato visado previo al inicio de las tareas, quedando a cargo de la Gerencia Técnica de la Dirección General de Obras Sanitarias Tandil, los trabajos de Inspección de la obra.

ARTÍCULO 3°.- CUSTODIA DE LA OBRA: Deberá asegurarse en todo momento y principalmente fuera de los horarios de trabajo, la protección de la perforación, zanjas, entubaciones y cañerías, contra la entrada de objetos extraños, fundamentalmente en caso de lluvia.

ARTÍCULO 4°.- NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Seguridad e Higiene N° 19.587, del Decreto 351/79 y de todas las normas conexas.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

En particular, deberá observar todas las disposiciones del Decreto 911/96 “Reglamento para la Industria de la Construcción”.

Al efecto, presentará al momento de la firma del Acta de inicio, el programa de prevención a desarrollar aprobado por la ART, la capacitación prevista, el reglamento interno en la materia, la organización del Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo, y el protocolo del Covid 19.

Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección suspenderá la certificación de los trabajos.

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1.- ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: En todo aquello que no se oponga a lo expresamente consignado en las presentes, serán válidas las Especificaciones Técnicas Generales que integran el Pliego de Licitación.

ARTICULO 2.- MEDICIONES: En todo aquello que se oponga a lo dispuesto en el presente Pliego, se seguirán las normas de medición de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas de la Nación.

ARTÍCULO 3.- INSTRUMENTAL PARA MEDICIONES: El Contratista pondrá a disposición de la Inspección, durante la ejecución de las obras, el instrumental y elementos necesarios a criterio de ésta para el cometido de sus funciones.

Los gastos que demande el cumplimiento de este Artículo se considerarán incluidos en los Gastos Generales del Contratista.

El nivel a utilizar para las inspecciones se deberá hallar en perfecto estado de funcionalidad y mantenimiento, descartándose aquellos que posean desgaste en sus movimientos. En caso de incumplimiento de este punto, la Inspección utilizará su propio instrumental con un costo de \$ 20.000,00 por día, aun cuando el trabajo se haya realizado en menos tiempo que el citado para la tarifa.

La empresa contratista deberá garantizar el traslado de la inspección a la obra cuando esta lo requiera.

ARTICULO 4.- CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR: En todos los casos la Dirección de Obra controlará la calidad óptima de los materiales a emplear, ordenando verificar la calidad de los mismos, cuando estime necesario, para lo cual el Contratista está obligado a hacer ejecutar las pruebas y ensayos que a tal efecto se ordenen.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

ARTÍCULO 5.- ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION: El Contratista procurará la energía eléctrica para la construcción de la obra (en las fuentes de trabajo, pruebas de obrador, balizamiento, etc.)

Asimismo, procurará el agua para la construcción y las pruebas hidráulicas bacteriológicamente aptas para las mismas.

ARTÍCULO 6.- RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y AJUSTES AL PROYECTO: Previo a la fecha de replanteo, el Contratista deberá haber verificado la ubicación de las instalaciones subterráneas existentes y pertenecientes a los distintos servicios de infraestructura (agua, cloacas, pluviales, electricidad, gas, teléfono, etc.). Así mismo deberá presentar el Proyecto Ejecutivo visado, contemplando las interferencias, este deberá presentarlo visado a la inspección para su aprobación asumiendo al momento de cotizar el conocimiento del terreno y la obra planteada, cualquier cambio introducido no dará derecho a reclamo alguno y deberá contemplar además los gastos por artículo 26i de la ley 12490.

Será responsabilidad del Contratista, recabar de los distintos organismos prestatarios de los servicios, las características y ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes. Consecuentemente, a la fecha de iniciación de las tareas que se establezcan en el Plan de Trabajos, habrá adoptado los recaudos necesarios para evitar deterioros que su labor pueda ocasionar en las mencionadas instalaciones y la reparación correrá a su cargo.

En caso que el representante técnico y el responsable del servicio de higiene y seguridad bajo su estricto análisis consideren necesario por razones de seguridad, se deberá presentar un estudio de suelos que contemple los diferentes tipos de suelos a encontrarse con el objeto de determinar el tipo de excavación, apuntalamiento y medidas de seguridad, dicho estudio de suelos deberá estar tener el visado colegial.

ARTICULO 7.- CAÑERIAS:

a) Red de Cloacas: Las cañerías a utilizar serán PVC UD del tipo cloacal según lo indicado expresamente en planos, contruidos y ensayados de acuerdo a normas IRAM respectivas. Las cañerías serán provistas por la Dirección General de Obras Sanitarias y entregadas al Contratista en el predio de aquella ubicado en Dinamarca y Bereterbide de esta localidad, en día hábil de 07:00 a 12:00 horas, corriendo por cuenta de aquel el traslado hasta la obra.

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

La presión de prueba de zanja para cañerías será de una columna de 2.00 mca.

Deberá colocarse por encima de la pretapada en la línea de la traza de la cañería una faja de seguridad normalizada de color rojo.

b) Red de Agua: Las cañerías a utilizar serán PVC UD clase 6 según lo indicado expresamente en planos, contruados y ensayados de acuerdo a normas IRAM respectivas. Las cañerías serán provistas por la Dirección General de Obras Sanitarias Tandil.

La presión de prueba de zanja para cañerías será de una columna de 7.5kg/cm²

Deberá colocarse por encima de la pretapada en la línea de la traza de la cañería una faja de seguridad normalizada de color azul.

ARTICULO 8.- BOCAS DE REGISTRO: Para la extensión de la red de Cloacas, en los lugares indicados se colocarán las bocas de registro de polipropileno y los marco y tapa de hierro fundido o fundición dúctil. Para tal fin se procederá a la excavación del lugar con un sobre ancho de 0.15 metros y hasta la profundidad especificada en los planos del proyecto ejecutivo más 0.15 metros, colocando luego una base de polvo de piedra perfectamente emparejada y compactada para soportar el cuerpo de la boca de registro de polipropileno. Una vez colocada ésta, nivelada, aplomada y con los empalmes hechos, se procederá a rellenar y compactar el espacio anular remanente entre la excavación y la boca de registro. Este relleno se realizará en forma anular y pareja, por capas con polvo de piedra o material similar compactando cada capa hasta llegar al nivel de la losa de tapa. La losa de tapa será de hormigón armado de 1.20 x 1.20 x 0.25 con malla Ø 12 mm cada 0.15 metros en hormigón H21 Sobre ésta se colocará el marco y tapa de hierro fundido, amurándolo convenientemente con hormigón de igual característica.

En aquellos casos donde no este definida la línea municipal o se dude la existencia de la misma, la empresa contratista deberá amojonar la línea municipal por un agrimensor bajo su exclusivo costo.

Al igual que las cañerías las bocas de registro y los marco y tapa serán provistos por la Dirección General de Obras Sanitarias y entregadas al Contratista en el predio de aquella ubicado en Dinamarca

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

y Beretebide de esta localidad, en día hábil de 07:00 á 12:00 horas, corriendo por cuenta de aquel el traslado hasta la obra.

Si como resultado del proyecto ejecutivo surgiere la necesidad de colocar bocas de registro adicionales, estas correrán por exclusivo cuenta y cargo de la empresa contratista.

El resto de los materiales como acero para construcción, hormigón, polvo de piedra y todo material necesario será provisto por el contratista.

Se deberán realizar las pruebas de estanqueidad de las Bocas registro.

ARTICULO 9.-PIEZAS ESPECIALES: Para la extensión de la red de agua, sus correspondientes piezas especiales serán provistas por la Dirección General de Obras Sanitarias Tandil.

Si como resultado del proyecto ejecutivo surgiere la necesidad de colocar piezas especiales adicionales, estas correrán por exclusivo cuenta y cargo de la empresa contratista.

En aquellos casos donde no este definida la línea municipal o se dude la existencia de la misma, la empresa contratista deberá amojonar la línea municipal por un agrimensor bajo su exclusivo costo.

ARTICULO 10.- EXCAVACIONES:

A los efectos de clasificar el suelo para las excavaciones se regirá por el siguiente criterio:

SUELO TIPO OS-A: Es todo aquel que puede ser extraído por medios mecánicos, es decir, con máquinas viales y sus implementos en caso de ser necesario. Suelo compuesto con material granular y/o cohesivo, desmoronable o no, con roca fracturada o no, arcillas y demás.

SUELO TIPO OS-B: Es todo aquel que no es posible retirar por medios mecánicos y conlleva la utilización de agentes de fractura externos como la utilización de voladuras y/o arcillas expansivas con el complemento del uso de compresor neumático.

En ambos casos las excavaciones se practicarán totalmente a cielo abierto. En correspondencia con calzadas pavimentadas con hormigón armado y en caso debidamente justificado y excepcional, el Contratista podrá efectuar el trabajo en túnel con tunelera, siempre que cuente con la debida autorización de la Inspección de Obra, dada por Orden de Servicio. En estos casos se exigirán perforaciones a distancias no superiores a 4 metros, que permitan rellenar el túnel con tierra y agua.

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

Cuando el Contratista haya concluido con esta tarea, deberá practicar nuevas perforaciones para verificar la calidad del relleno realizado. Este operativo se repetirá tantas veces como la Inspección lo estime necesario.

Independientemente del método empleado se liquidará como si la excavación se hubiese realizado a cielo abierto según el tipo de suelo que se detallará más adelante.

El Contratista es responsable del método a emplear, así como toda eventualidad emergente en la tarea. No obstante, y en lo que se refiere a la colocación de la cañería, no se admitirá un ancho de zanja superior a una vez y media el diámetro externo, a la altura del intradós del caño. En casos especiales la Inspección de Obra, podrá autorizar anchos mayores, siempre que se compruebe la seguridad a rotura por efecto de las cargas externas.

Como asiento de la cañería se ejecutará un manto de arena en el ancho total de la zanja, no menor de 0,10 m. de espesor, compactado con la humedad óptima, nivelado y conformado de tal manera que acompañe la pendiente de la misma y a su vez permita un apoyo en una superficie transversal igual, como mínimo al tercio de circunferencia (120° sexagesimales). El relleno de zanja se hará con suelo seleccionado 0-6 (tamaño máximo agregado 6mm) para la pretapada, y la restante tapada hasta completar el relleno con granulometría 0-20 (tamaño máximo agregado 20mm).

En zonas de suelo rocoso y donde la inspección en conjunto con la gerencia operativa de agua lo dispongan será indispensable la ejecución de una cama de asiento en óptimas condiciones.

El costo de la arena y del suelo seleccionado se considerará incluido en el de colocación de cañería.

Si se detectase áridos de mayor tamaño en el relleno se procederá de inmediato al retiro de todo el suelo de relleno y a su reemplazo.

En la zona urbana el material extraído como consecuencia de la realización de los trabajos autorizados deberá ser colocado en cajones desmontables, evitando en todos los casos su dispersión y obstrucción de desagües pluviales.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

El suelo sobrante deberá ser transportado hasta una distancia de 10 mil metros según lo indique la inspección.

La liquidación se hará conforme el ítem correspondiente si se trata de suelo tipo A o tipo B que será analizado, cubicado y documentado en el lugar

SE PROHIBE EXPRESAMENTE LA UTILIZACION DE SUELO PARA RELLENO DE ORIGEN VEGETAL O CON GRANULOMETRIA SUPERIOR O IGUAL a 6mm.

DEBERA CONTEMPLARSE EL RECAMBIO DE SUELO RESULTANTE DE LA EXCAVACION EN CASO DE SUELOS DE TAMAÑO MAYOR O IGUAL a 6mm.

ARTÍCULO 11.- COLOCACION DE CAÑERIA: Para la colocación de cañerías serán respetadas las Especificaciones Técnicas Generales que tratan este tema, las que rigen en todo lo que se oponga a las presentes.

S otorgará la máxima dedicación a la compactación en la zona de los riñones del caño, la que se practicará exclusivamente con herramientas de mano y con grado óptimo de humedad.

Así mismo para verificar que no exista aplastamiento de cañerías del tipo clase 4 cloacal, la empresa contratista procederá al mandrilado de todos los tramos con un mandril aprobado por la inspección de diámetro no inferior al 95% del diámetro interior de cañerías.

ARTÍCULO 12.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEREDAS: El Contratista deberá cubrir con maderas o chapas adecuadas los pozos abiertos en las veredas y será el único responsable por los posibles accidentes o daños a personas o bienes de terceros.

Asimismo, efectuará y mantendrá el balizamiento, señalización e iluminación de dichos obstáculos de acuerdo a lo indicado en la Ordenanza N° 3867/86 y sus modificatorias y a las órdenes impartidas por la Inspección. Siendo la empresa contratista la una responsable por la deuda señalización y el mantenimiento de las mismas durante el periodo de obra.

ARTICULO 13.- CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES: Además de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas Generales y en éstas sobre excavación, disposición de pasarelas y planchadas, señalización y demás medidas de seguridad, etc., el Contratista deberá dar el más

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas Municipales respectivas, considerándose que, con la sola presentación de la propuesta, declara conocerlas y haberlas contemplado.

Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la Autoridad Municipal y/o cargos que la misma establezca por daños emergentes atribuibles al incumplimiento de las mencionadas Ordenanzas.

ARTICULO 14.- FRENTE DE OBRA: Los frentes de obra también deberán estar atendidos durante el período que media entre la finalización de la jornada de labor y la iniciación de la siguiente por personal del Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar funcionando las señales de seguridad, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente Artículo, deberán ser considerados por el Contratista dentro de sus Gastos Generales.

ARTICULO 15.- RECONSTRUCCION DE VEREDAS, PAVIMENTOS, CALLES DE TIERRA: En el caso que sea necesario realizar roturas de pavimento o cortes de calles, el Contratista DEBERA CUMPLIR EN UN TODO Y DE ACUERDO SEGUN EL DIRECTIVAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD MUNICIPAL DE ACUERDO A SU INSTRUCTIVO PARA REPARACIONES DE PAVIMENTOS e informará a la Dirección de Obra con 5 (cinco) días hábiles de anticipación, y a la Dirección de Inspección General para que ésta programe los cortes de tránsito y transporte público.

Para las roturas de pavimento primeramente se aserrarán los bordes del pavimento a romper, de forma tal de crear una línea pareja y prolija para la futura repavimentación. Una vez aserrado se procederá a la rotura del pavimento con elementos mecánicos.

Se deberá aserrar y romper el pavimento al menos 0.30m a ambos lados de las paredes del zanjeo a fin que la losa de reparación tenga en sus extremos los apoyos en suelo consolidado.

Una vez colocada la cañería, rellena y compactada la zanja hasta 0.40 metros por debajo del nivel de pavimento, se realizará un suelo cemento de 0.20 metros de espesor y con la aprobación escrita de la Dirección de Vialidad Municipal. Posteriormente se procederá a realizar la reparación de pavimento. En los casos que la reparación sea con hormigón, éste será de característica H30, provisto

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

por alguna empresa dedicada a la elaboración de hormigón en planta dosificadora por peso, quedará además por cuenta del contratista las tareas de colocación, compactación, vibrado y terminación. En el caso de que el pavimento sea de material bituminoso, se realizará una sub base de suelo cemento hasta cota -0,20 metros, luego se colocará una carpeta de hormigón de 0.15 metros de espesor con terminación rugosa para poder recibir la carpeta asfáltica de terminación de 0.05 metros. Se deberán reparar la totalidad de las veredas.

En aquellas calles donde se realizan las tareas de excavación y colocación cuya calzada es de tierra, arenado o estabilizado, u otro material granular, deberán ser reparadas de inmediato una vez finalizadas las tareas en dicho tramo, para ello se deberá reponer el material de calzada o reemplazarlo en caso de haberlo mezclado con suelo de la excavación. Dichas tareas serán inspeccionadas por la Dirección de vialidad y deberá ser informada por la empresa contratista previo al inicio de las tareas.

Cada tramo que implique la obra deberá ser recibido por la Dirección de vialidad la que emitirá un acta de recepción, siendo esta, condición necesaria para la solicitud de la recepción provisoria ante la inspección de obra una vez finalizada la misma.

La empresa contratista deberá contemplar la reparación total de las veredas afectadas por la obra reponiendo los solados en caso de existir, como así también deberá reponer las especies forestales que puedan ser extraídas durante la obra.

Los gastos que genere esta tarea se consideran incluidos en el ítem excavación.

ARTÍCULO 16.- CUADRAS ABIERTAS: No se admiten cuadras abiertas al término de la jornada laboral.

ARTÍCULO 17.- DOCUMENTACION CONFORME A OBRA: Culminada la obra y previo a la habilitación de cañerías, el representante técnico deberá entregar en soporte papel y digital los planos conforme a obra y los diagramas de cuadra con las conexiones

**LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS
2025 - 2026”**

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES

ARTÍCULO 1: NORMAS LEGALES: Las obras objeto de la presente licitación se someterán a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Además le serán de aplicación supletorias las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley N° 6021 de Obras Públicas, su Reglamento; toda otra normativa vigente a la fecha de licitación. La citada Legislación se entiende como integrante de este Pliego.

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes.

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera que cualquier omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.

La Adjudicataria deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u omisiones del Presupuesto Oficial y realizar los trabajos según planos y pliegos a efectos de que la obra cumpla con la finalidad de la construcción.

ARTÍCULO 2: NORMAS CONTRACTUALES: La Ley de Obras Públicas N° 6021, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 (T.O. 1976 - Código de Obras Públicas - Libro I) y sus modificatorios, en cuanto a las cláusulas de carácter contractual conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión, las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes.

En los casos que existiere contradicción entre los mismos, se seguirá el orden de prelación establecido en el Artículo 32°, Apartado 14 del Decreto N° 5488/59.

Los distintos documentos del contrato se complementarán entre sí de manera que cualquier omisión de uno de ellos quede salvada por su referencia en el otro.

ARTÍCULO 3: INTERPRETACIONES: Siempre que en estos documentos se especifique "MUNICIPALIDAD" o "MUNICIPIO" se refiere a la Municipalidad de Tandil, "INTENDENTE" al señor Intendente Municipal de Tandil, "INSPECCIÓN" al personal designado por la Municipalidad para la supervisión total de la Obra, "CONTRATISTA" a la persona o empresa a quien la Municipalidad

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

adjudique la Obra, "OBRA" al objeto del contrato y extensión de la misma, "PLIEGO" al presente pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 4: OBJETO: El presente proceso licitatorio tiene por objeto la contratación de mano de obra y la provisión de los materiales y herramientas necesarios para la ejecución total de la obra: **"Ampliación de redes de agua y cloaca en diferentes calles FOS 2025-2026"**, según lo descripto en la memoria técnica y conforme lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales, Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Legales, planos y la planillas de Cómputo y Presupuesto que componen el presente pliego.

ARTÍCULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece como monto oficial para la realización de toda la obra la suma de **pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 14/100 (\$225.868.850,¹⁴)**.

ARTÍCULO 6: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La obra se llevará a cabo mediante el sistema de **UNIDAD DE MEDIDA**, realizándose un contrato entre el Municipio y la firma que resulte adjudicataria de la obra.

ARTÍCULO 7: LUGAR Y FECHA DE APERTURA: El acto de apertura del presente proceso licitatorio se realizará el día y hora que establezca el **Decreto de Llamado adjunto**, en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil, ubicada en calle Belgrano N°417, planta alta, oficina 6 de nuestra localidad, o en la oficina/sala que se designe a tal fin, con la presencia (no obligatoria) de los oferentes que deseen participar.

ARTÍCULO 8: SOLICITUD Y CONSULTA DE LEGAJOS: Los planos, memoria descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones, planillas y demás antecedentes podrán ser consultados por los interesados en la Web Municipal. El Pliego no tendrá costo y estará disponible para su adquisición solicitándolo al siguiente correo: **compras_proveedores@tandil.gov.ar**, desde su publicación hasta 5 días hábiles antes de la apertura, inclusive.

Toda documentación que supere a la consignada en el párrafo anterior y que fuere necesario para el Contratista, se le suministrará mediante la reposición del sellado que fije la Legislación vigente.

En caso de dudas, sólo serán considerados los pedidos de aclaración que registren fecha de entrada anterior a los 3 (tres) días hábiles de la fijada para el acto de apertura de la licitación, excluido dicho día.

Las aclaraciones y respuestas, se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la licitación y serán incorporados al Legajo completo como formando parte de él.

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

ARTÍCULO 9: DOMICILIO LEGAL Y ELECTRÓNICO DE LOS ADQUIRENTES: Los adquirentes del presente Pliego deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Tandil y domicilio electrónico. Si la Municipalidad resolviera notificar a las Empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la licitación de la obra, como documentación de propuesta, fecha de apertura, etc. no se considerará a tales efectos las que, habiendo retirado el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones no hubieran constituido domicilio legal en el radio señalado, perdiendo todo derecho a reclamo por no haber recibido las notificaciones en sus domicilios fuera del Partido de Tandil.

ARTÍCULO 10: INSCRIPCION: Para ser admitidos en la presente licitación todo proponente deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Tandil (Dirección de Compras y Suministros).

ARTÍCULO 11: INFORMES A OBTENER POR LOS OFERENTES: La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido los informes pertinentes en relación a los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la obra, así como acerca de cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de la misma. Asimismo presume que se han informado respecto a la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, presunción que no limita para los casos que correspondiere, el derecho que admite el Artículo 38° de la Ley 6021 y su Decreto reglamentario.

ARTÍCULO 12: CONOCIMIENTO DE LA OBRA: Es condición ineludible que los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan a los fines de:

- Conocer las características y condiciones de la obra;
- Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la misma;
- Determinar las condiciones necesarias de provisión de agua, energía eléctrica, etc.;
- Conocer las omisiones o errores que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial o en el Pliego;

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta presentada.

Atento el predio donde se realizaran la obra no son de libre acceso y no están perfectamente delimitados, la visita de obra será obligatoria, el responsable de coordinar el día o días de visita será el encargado de llevar el proyecto adelante, la comunicación deberá realizarse con la Dirección

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

de Obras Públicas.

ARTÍCULO 13: INHABILIDADES PARA OFERTAR: No podrán participar en esta licitación, por sí o por interpósita persona:

- Los quebrados mientras no hayan sido rehabilitados;
- Los concursados, excepto que acompañen póliza de seguro de caución, fianza o aval bancario equivalente al 120% del presupuesto oficial. Esta garantía es independiente a las demás requeridas en el presente pliego. La misma deberá cumplir con los requisitos estipulados en el artículo de las GARANTÍAS;
- Los inhabilitados por condena judicial;
- Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la Municipalidad de Tandil;
- Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la Municipalidad;
- Los que sufran inhibición general de bienes;
- Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal;

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobare con posterioridad a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para presentarse en futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) años. Además de ello, procederá a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato (según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de garantía de la oferta o del contrato según el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial.

ARTÍCULO 14: CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberán presentar los siguientes requisitos de capacidad:

A. **Certificados de Capacidad:** El oferente podrá presentar alguno de los siguientes Certificados de Capacidad:

- El **Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera** del Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires;

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

- El **Certificado de Capacidad de Contratación Anual** expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Los mismos deberán estar vigentes. En caso de encontrarse próximos a su vencimiento, el oferente deberá acompañar constancia de haber iniciado los trámites de renovación pertinentes.

El monto disponible de capacidad deberá ser igual o superior a pesos trescientos setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochenta y tres con 57/100 (\$376.448.083,⁵⁷).

B. **En caso de no contar con ninguno de los certificados** enunciados en el inciso anterior, el oferente deberá presentar:

- Balances Contables** correspondientes al **último ejercicio exigible**, debidamente autenticados.
- Calificación Bancaria** expedida por entidad con la cual opere regularmente: La entidad bancaria deberá indicar cuales son las líneas crediticias otorgadas al solicitante, por ejemplo, en préstamos de capital de trabajo, descuentos de cheques, acuerdos de descubiertos, etc. La misma deberá ser de fecha actual. En caso que la misma no sea acompañada por el oferente, se tomara la que publique el Banco Central de República Argentina.

ARTÍCULO 15: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán presentadas en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil hasta el día y hora indicados para el Acto de Apertura de la licitación, siendo inadmisibles las presentadas posteriormente, aun cuando el Acto de Apertura sea llevado a cabo con demora.

ARTÍCULO 16: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las ofertas serán presentadas en formularios idénticos a los anexados al presente Pliego, siendo el oferente exclusivo responsable de los errores que cometiese en su redacción. Las propuestas deberán redactarse en idioma castellano, escritas en computadora, sin enmiendas, raspaduras, entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados. El incumplimiento de éste requisito podrá ser causal de inmediato rechazo de la propuesta.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

ARTÍCULO 17: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta deberá ser presentada en dos sobres, consignando en ambos la referencia “**Licitación Pública 03-01-26, sobre N° 1 o N° 2**”, según corresponda. Los sobres deberán contener la siguiente documentación:

Sobre N°1:

- a) **Garantía de la propuesta formalizada en alguna de las modalidades determinadas en el artículo siguiente;**
- b) **El presente Pliego completo debidamente firmado y aclarado por el oferente y su representante técnico en todas sus hojas;**
- c) **Contrato Profesional por el estudio y propuesta de licitación, firmado por profesional en calidad de representante técnico con incumbencias específicas en la obra, debidamente visado por el respectivo Colegio Profesional;**
- d) **Declaración Jurada de aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Azul, ante cualquier situación legal que se suscite, Declaración Jurada de no encontrarse inmerso en alguno de los impedimentos descriptos en el artículo 13, Constitución de domicilio legal en la ciudad de Tandil, y constitución de domicilio electrónico, al cual se cursarán todas las notificaciones pertinentes. Deberá utilizarse el FORMULARIO FDGS 01 ADJUNTO;**
- e) En caso de ser el oferente **persona jurídica**, documentación que acredite que el o los signatarios de la oferta están habilitados para representar a la sociedad formulando oferta y obligándola.

En caso de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación o de unión transitoria de empresas –en adelante “agrupaciones” o “consorcios”–, el contrato que los sustente deberá establecer claramente un objeto compatible con la presente licitación y su plazo de duración, del que deberán adjuntar copia certificada notarialmente con legalización del Colegio de Escribanos en caso de haber sido expedida en jurisdicción diversa de la Provincia de Buenos Aires.

Para las agrupaciones que se acuerden al solo efecto de esta licitación, su plazo de duración en ningún caso podrá ser inferior al que razonablemente demande la ejecución total de la obra que se licita.

Para las agrupaciones constituidas con anterioridad y en caso que la ejecución de la obra supere el plazo de duración del contrato de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación o unión transitoria de empresa, deberán prorrogar su vigencia por el tiempo que demande la conclusión de la obra. En caso que el plazo de duración del contrato de colaboración empresarial venciera en el período que transcurra entre la fecha de apertura del sobre n° 1 y la de apertura del sobre n° 2, deberán acreditar la celebración del acuerdo de prórroga y el inicio del trámite de

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

inscripción respectivo, asumiendo el compromiso de la conclusión del trámite correspondiente.

En el contrato base de las agrupaciones o consorcios, los miembros deberán asumir en forma expresa la plena responsabilidad principal, solidaria, ilimitada e indistinta, frente a la Municipalidad, por todos los efectos de la oferta y del contrato objeto de la presente licitación. Deberá presentarse la documentación exigida, respectivamente, por la Ley 19.550 con las modificaciones de la Ley 22.903 o la Ley 26.005.

Las Garantías de Oferta, de Contrato y en su caso de Anticipo Financiero, deberán ser presentadas o emitidas en forma conjunta por todos los otorgantes de la agrupación o consorcio;

f) **Listado de obras ejecutadas** en **similares** características técnicas y económicas a la obra que se licita, comprobadas mediante sus respectivas Recepciones Finales o Provisorias, **y listado de obras en curso de ejecución**, esta información debería contener como mínimo: monto de contrato, monto ejecutado, plazo de obra y fecha de inicio, ubicación de la obra y descripción. El Municipio podrá descalificar aquellas ofertas de empresas que no hayan acreditado la ejecución de obras de similares características;

g) **Documentación referida a la capacidad técnica financiera** de la entidad, mencionada en el artículo 14;

Sobre N°2:

h) **Planilla de Propuesta Básica Obligatoria y Propuesta Alternativa (opcional) con Anticipo Financiero de hasta un 20% en idéntico formato que las integrantes en el presente pliego;**

i) **Planilla de Cómputo y Presupuesto en idéntico formato y contenido que la integrante en el presente pliego;**

j) **Planilla de Cómputo y Presupuesto en formato digital la misma puede ser vía mail a las 24 horas de la apertura o adunada en algún soporte digital en el momento de la misma.**

Todas ellas deberán ser suscriptas por el oferente y por un representante técnico.

El incumplimiento de los requisitos consignados en los apartados a, b, c, h e i, considerados como esenciales al efecto de este proceso de selección, serán causal de rechazo inmediato de la propuesta, sea que se tome conocimiento al momento de la apertura o a posteriori.

La omisión o insuficiencia en la presentación de los demás requisitos consignados en el presente artículo podrá ser salvado en el plazo y forma que al efecto se otorgue en el Acto de Apertura, o en el

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

momento en que se tome conocimiento de los mismos. La Municipalidad podrá dispensar el cumplimiento de algunos de los requisitos no considerados como esenciales, cuando lo crea pertinente.

ARTÍCULO 18: GARANTÍA DE OFERTA: La garantía de oferta deberá constituirse por el importe de **pesos dos millones trescientos mil (\$2.300.000)** y podrá ser presentada en cualquiera de las siguientes modalidades:

- Depósito en efectivo en Tesorería Municipal;
- Fianza o aval bancario;
- Póliza de Seguro de Caución Digital debidamente certificada y en su caso legalizada por el respectivo colegio;

La fianza o aval bancarios y la póliza de seguro de caución deberán constituir al garante en fiador principal pagador o codeudor solidario, se mantendrá vigente por todo el lapso que transcurra hasta la firma del contrato por el importe establecido y con expresa renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión.

Las firmas de las fianzas y/o avales bancarios y las pólizas por seguro de caución deberán autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio. ***En caso de ser de jurisdicción ajena a la Provincia de Buenos Aires, deberán legalizarse por el respectivo Colegio.***

Se agrega ejemplo de conformación de legalizaciones, puesto que hemos observado faltantes en reiteradas ocasiones.

Agregamos ejemplo Caución:



LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

Se manifiesta Ejemplo Certificación por Escribano de la Póliza Caución:



Se manifiesta Ejemplo Legalización por caso de extraña jurisdicción de póliza de caución:



Si se constituyera en efectivo, deberá efectuarse el depósito en la Tesorería Municipal, colocando en el sobre N° 1 el recibo correspondiente. No se admitirá en el sobre, dinero en efectivo. En caso de realizarse el depósito de garantía mediante cheque, los fondos deberán estar acreditados en la cuenta municipal al momento de la apertura.

Si el Oferente hubiere optado por presentar una oferta alternativa según el artículo 17° (Sobre N° 2) y la misma resultara adjudicada, el anticipo financiero se pagará por el licitante contra la constitución y otorgamiento a favor y satisfacción de la Municipalidad de Tandil de una Garantía de Anticipo Financiero por el ciento por ciento (100%) del monto que se anticipe, la cual deberá ajustarse a lo

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

establecido en el artículo 37°.

Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el pago anticipado, aunque su monto podrá ser reducido progresivamente siempre y cuando la naturaleza de la garantía convenida lo permita y en la medida del grado de avance de la obra.

ARTÍCULO 19: AUTENTICIDAD DE LAS OFERTAS: Para toda copia o fotocopia de la documentación que se presente a la licitación, la Comisión de Pre adjudicación podrá solicitar la autenticación por Escribano Público y legalización por el Colegio respectivo, en el caso que el certificado fuera de jurisdicción extraña. Se exceptúa del presente aquellas autenticaciones que expresamente se soliciten en otros artículos y que por lo tanto deberán incluirse en la Licitación, no pudiéndose suplir ni durante ni después del Acto Licitatorio.

ARTÍCULO 20: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de **treinta (30) días corridos** a partir de la fecha fijada para la Apertura del Acto. Vencido dicho plazo, si el oferente no se hubiere retractado de su oferta en forma fehaciente dentro de los **cinco días (5)** anteriores ha dicho vencimiento, la propuesta se considerará automáticamente prorrogada por igual término.

El plazo de mantenimiento de las propuestas, en todo caso, quedará prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito. Si la retractación se produjera durante el período de mantenimiento de la oferta, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía.

En caso de que el oferente deba subsanar la presentación de documentación para participar, la prescripción del plazo de mantenimiento de oferta quedará suspendida de pleno derecho, desde la fecha de apertura hasta la subsanación del vicio.

ARTÍCULO 21: DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA: Cuando el oferente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el periodo de su mantenimiento, se le ejecutara la garantía de oferta constituida y podrá sancionárselo con la suspensión del registro de proveedores por un periodo de hasta tres (3) años y sin perjuicio de iniciar las acciones a que hubiera lugar. Cuando el oferente que desistiera de su propuesta antes de tiempo, resultare el primero en orden de mérito, tal actitud dará lugar al cobro de una multa equivalente al monto que resulte de la diferencia entre su propuesta y la que deba adjudicarse en la misma contratación.

ARTÍCULO 22: DÍA INHÁBIL. PÓRROGA DE APERTURA: Si el día fijado para el acto de apertura del sobre fuera declarado feriado o de asueto administrativo, o se produjera algún hecho imprevisible que por razones de fuerza mayor impidiera la ejecución del citado acto, el mismo se realizará el día

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, o en fecha y hora establecida por la Dirección de Compras y Suministros.

ARTÍCULO 23: APERTURA: El acto de apertura del presente proceso licitatorio será llevado a cabo en lugar y fecha consignados en el artículo 7 y será realizado por los funcionarios integrantes de la Comisión de Apertura, con la presencia de los señores oferentes que deseen asistir.

En el lugar, fecha y hora establecidos, las autoridades encargadas de fiscalizar la licitación procederán a dar por iniciado el Acto. Al abrir los sobres N°1, procederán a verificar que los oferentes hayan cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 9 a 18 del presente Pliego. Toda presentación que configure incumplimiento de los artículos mencionados podrá ser rechazada y las autoridades actuantes podrán abstenerse de abrir el sobre N°2. En este supuesto, deberán devolver el sobre al oferente con la leyenda “rechazado por no ajustarse a los requisitos establecidos para la presentación de la documentación licitatoria”, dejando constancia de lo antedicho en el Acta de Apertura.

El resto de los sobres presentados que cumplan con los requisitos establecidos serán abiertos y escrutados. De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura, que contendrá:

- Nómina de los Proponentes;
- Modalidad de garantías presentadas y sus respectivos montos;
- Monto y tipo de oferta presentado por cada uno de los oferentes
- **Si las hubiere, nómina de las propuestas rechazadas y el motivo de su rechazo.**

El Acto de Apertura del proceso licitatorio es de carácter solemne. Cualquier transgresión de los requisitos formales de su presentación la anulará insalvablemente. Para asegurar la validez del acto, deben respetarse las siguientes condiciones:

Las propuestas se considerarán de propiedad exclusiva de los encargados de fiscalizar el Acto de Apertura. En ningún momento serán devueltas a los proponentes sin haber sido previamente consideradas. Solo harán excepción las propuestas rechazadas por las causas previstas en el presente Pliego.

Está prohibido a los oferentes efectuar manifestaciones relativas a las causas de rechazo de las propuestas previstas en el Pliego. Cualquier aclaración que el proponente considere pertinente realizar será transcripta en el Acta de Apertura y oportunamente considerada por autoridad competente.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

El Acta de Apertura será suscripta por todos los licitantes presentes y los funcionarios intervinientes.

ARTÍCULO 24: COMISIÓN DE APERTURA: La Comisión de Apertura estará integrada por el Director de Compras y Suministros, el Secretario de Planificación y Obras Públicas, el Director General de Obras Sanitarias y/o dependientes designados por ellos para su reemplazo.

ARTÍCULO 25: IMPUGNACIONES: Todos los oferentes admitidos por la Comisión de Apertura podrán tomar vista de las ofertas, dentro de los dos (2) días posteriores al cierre del acto de apertura en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Tandil.

En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser presentadas con la firma del impugnante, certificada ante escribano público y la de éste legalizada por el respectivo Colegio Profesional, así como constancia de haber constituido la garantía prevista.

Conjuntamente deberá presentarse una garantía de impugnación. Dicha garantía deberá constituirse por cada una de las presentaciones realizadas, en un monto equivalente al veinte por ciento del monto establecido para la garantía de oferta. La misma deberá constituirse en efectivo en la Tesorería Municipal. Será devuelta sin ajuste ni indemnización a quien su pretensión le sea acogida favorablemente, dentro de los cinco (5) días hábiles de ser solicitada formalmente.

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, ofreciéndose o aportándose las pruebas que hagan a los cargos formulados. El plazo para presentar las impugnaciones será de 48 hs. de haber vencido el plazo para tomar vista del expediente administrativo.

ARTÍCULO 26: CONTINUIDAD DEL TRAMITE – RESOLUCION DE IMPUGNACIONES: La presentación o interposición de recursos o impugnaciones no suspenderá el tramite licitatorio y no dará lugar a la suspensión de la adjudicación ni de los tramites posteriores relacionados con la ejecución del contrato, excepto cuando por razones de interés público así lo disponga la Comisión de Pre adjudicación o, en su caso, el Departamento Ejecutivo.

ARTÍCULO 27: MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas admisibles, hubieren dos o más en igualdad de condiciones y con una diferencia de precios igual o inferior del cinco por ciento (5%), la Municipalidad podrá convocar (a su exclusivo juicio) a mejora de precios mediante sobre cerrado y para el día y hora que al efecto se señale, entre esos proponentes exclusivamente.

ARTÍCULO 28: RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECHAZO DE LAS OFERTAS: La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de las mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su aceptación, ni a formular reclamo alguno.

ARTÍCULO 29: COMISION DE PRE ADJUDICACION: Sera la responsable de la evaluación técnico financiera de las ofertas recibidas y del establecimiento del orden de mérito de las mismas, y estará

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

compuesta por el Director General de Obras Sanitarias, el área de Gestión de Procesos y el responsable designado para la inspección de obra, o quienes se designen en su reemplazo.

La adjudicación aconsejada por la Comisión de Pre adjudicación recaerá en la oferta más conveniente de acuerdo al libre criterio del mencionado órgano.

Ante el caso que algún oferente no pueda demostrar su capacidad económica/financiera para hacer frente a la obra mediante la presentación de lo requerido en el ARTÍCULO 14: CAPACIDAD DE LOS OFERENTES, siempre quedara en último lugar de mérito, independientemente del monto de su oferta. Se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas con domicilio y/o establecimiento comercial en el Partido de Tandil, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a oferta y demás condiciones ofrecidas, con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas con domicilio comercial y/o establecimientos comerciales en otros partidos o provincias. La prioridad a favor de los oferentes locales no será de aplicación en caso que la oferta ofrecida sea superior en un cinco por ciento (5%) al de las ofertas presentadas por quienes no resultan beneficiarios del principio referenciado.

ARTÍCULO 30: RECUSACIONES: Las recusaciones a los miembros de la Comisión de Pre Adjudicación se registrarán por las normas respectivas de la Ordenanza General 267/80 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 31: COMPRE TANDIL: Conforme lo normado por la Ordenanza n° 16721, se manifiesta lo siguiente:

Entiéndase como Proveedores Locales para la presente ordenanza y a los fines de “Compre Tandil”, a todas las empresas y/o individuos proveedores de insumos, bienes, servicios y/o contratos de obras, que se encuentren radicadas en el Partido y cuenten con habilitación municipal, con un período de anticipación de 12 meses al momento de la compulsa de precios que se encuentre en análisis, estar inscriptos en el registro de Proveedores Municipal, y ser contribuyentes de la Tasa Unificada de la Actividad Económica y del impuesto a los Ingresos Brutos.

La presente Ordenanza será de aplicación en todas las contrataciones que promuevan las distintas dependencias municipales, cuando la diferencia de precios no supere el 5% (cinco por ciento) y la calidad de los bienes y/o servicios comparados respondan a los estándares técnicos exigidos en el Pliego de la contratación.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

Las empresas locales que hubieran cotizado dentro de los márgenes establecidos en el artículo precedente, serán convocadas a una mejora de oferta, en la que deberán igualar (al menos) o superar la mejor oferta que se hubiera recibido, lo que la habilitará para ser beneficiada con el derecho de prioridad para resultar adjudicataria de la compulsa.

ARTÍCULO 32: ADJUDICACION: La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Pre adjudicación, recaerá sobre la Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la Municipalidad, siempre que ella se ajuste a las condiciones establecidas en la licitación, considerando según corresponda:

- Importe de la propuesta;
- Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares a la solicitada;
- Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o variantes complementarias.

En igualdad de condiciones, se otorgará prioridad a los oferentes de Tandil, considerándose como oferente de Tandil a aquellos domiciliados dentro del Partido, que desarrollen actividad y que abonen los tributos Municipales.

ARTÍCULO 33: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación se entenderá formalizada mediante **Decreto** que al efecto dictará el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificación al adjudicatario en su domicilio legal o constituido al efecto para la Licitación.

Dentro de los siete (7) días hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá cumplimentar la garantía que hace mención el artículo 36. En caso de incumplimiento, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 82.

ARTÍCULO 34: REPRESENTANTE TECNICO: Deberá poseer **Título Universitario de Ingeniero**, el que deberá estar inscripto en el Registro, de acuerdo a las Leyes 10.405, 10.416 y 10.411, junto con sus Decretos Reglamentarios. Su permanencia en obra se especificará en cláusulas particulares cuando el tipo de obra lo requiera.

ARTÍCULO 35: OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: Además de las obligaciones que establece para el Representante Técnico la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y las que podrá establecer el Pliego de Bases y Condiciones Legales o el de Especificaciones Técnicas, éste deberá estar presente en todas las operaciones de carácter

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

técnico que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, recepción provisoria, recepción definitiva, debiendo firmar todas las actas respectivas.

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, inhabilita al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada.

El Representante Técnico se hará directa y solidariamente responsable con la empresa contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus resultados. Antes del inicio de la obra deberá presentar copia del contrato con el profesional, visado por el Concejo de Profesionales y la Caja de Previsión de Profesionales correspondiente en la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, conjuntamente con los certificados mensuales de obra deberá presentar copia del comprobante de pago de los aportes profesionales.

ARTÍCULO 36: GARANTIA DE CONTRATO, GARANTÍA DE ANTICIPO: Sera requisito previo a la suscripción del Contrato Administrativo de Obra Pública que el adjudicatario otorgue a favor de la Municipalidad, la garantía por cumplimiento de contrato, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la oferta adjudicada, la que deberá constituirse en alguna/s de las siguientes modalidades:

- Depósito en efectivo en Tesorería Municipal
- Fianza o aval bancario.
- Póliza de seguro de caución.

Esta Garantía de Contrato, cubre las responsabilidades emergentes de los incumplimientos contractuales en que incurriera el Adjudicatario, comprendiendo los perjuicios que sufra el Municipio a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de estas, así como el pago de las multas que no satisfaga en término de la intimación que se le efectúe.

Será devuelta al Contratista dentro de los treinta (30) días corridos inmediatos siguientes a la fecha en que se efectúe la Recepción Provisoria de las obras.

Tratándose de depósitos en dinero en efectivo, será restituido por el importe de su valor nominal, sin que resulten exigibles intereses de ningún tipo, indexación, actualización o repotenciación alguna.

Tratándose de una póliza de seguro de caución, deberá mantenerse vigente hasta la Recepción Provisoria, las firmas deberán certificarse ante Escribano Público y, en caso de ser de jurisdicción

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

ajena, autenticarse por el Colegio respectivo. Tampoco se computará desvalorización ni intereses, ni derecho a reintegro, reembolso o indemnización alguna por las primas abonadas durante la vigencia de aquella.

La Garantía, deberá permanecer inalterable, y en caso de que se produjeran afectaciones de la misma, en el plazo de diez (10) días hábiles de notificada la Contratista de ello, deberá integrar la diferencia hasta completar el monto total de dicho depósito, bajo pena de resolver el contrato por su culpa.

La Garantía de Contrato que se otorgue y constituya no implica limitación alguna de la responsabilidad contractual en que pudiera incurrir la empresa Contratista. El Municipio puede ejecutar la garantía a cuenta del mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a exigir el resarcimiento integral derivado del o los incumplimientos de la Contratista, incluso los que reconozcan su causa en el nuevo contrato que deba celebrar el Municipio para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de ésta.

GARANTÍA FINANCIERA: Si se hubiere optado por presentar una oferta alternativa según el artículo 17º (Sobre Nº 2) y la misma resultara adjudicada, el anticipo financiero se pagará por el licitante contra la constitución y otorgamiento a favor y satisfacción de la Municipalidad de Tandil de una Garantía de Anticipo Financiero por el ciento por ciento (100%) del monto que se anticipe, podrá constituirse y otorgarse por alguno/s de los siguientes modos:

- Aval o fianza bancarios;
- Títulos públicos, bonos o letras de tesorería, certificados de deuda pública o cualquier otro valor similar;
- Póliza de seguro de caución;
- Derecho real de hipoteca.

Tratándose de aval o fianza bancarios, deberán constituir al garante en fiador principal pagador o codeudor solidario, con expresa renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión. Los instrumentos en los que se extiendan el aval o fianza bancarios deberán autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio en caso de ser de jurisdicción ajena a la de la Provincia de Buenos Aires.

En caso que la garantía se constituyera mediante la cesión en garantía de títulos públicos, bonos o letras de tesorería, certificados de deuda pública o cualquier otro valor similar, deberán observarse las siguientes prescripciones:

A los efectos de la integración de la garantía, serán dados por el Contratista y tomados por el

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

Municipio por su valor nominal.

Deben ser emitidos por el Estado Nacional o la Provincia de Buenos Aires, y en este último caso que coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Si los títulos o bonos generasen intereses o se liquidaren y pagaren anticipos de capital, el Municipio deberá gestionar el cobro de los mismos y los retendrá también en carácter de garantía.

La titularidad de los títulos o bonos dados en garantía, sus intereses o amortizaciones de capital, pertenecen al Contratista.

El Contratista no podrá transferir los títulos o bonos dados en garantía sin autorización o conformidad expresa del Municipio.

Si por incumplimiento del contratista se ejecutaran estos títulos o valores, se formulará cargo por los gastos ocasionados y por la diferencia si fueran vendidos bajo la par. En el caso de que produjeran excedente, el mismo quedará a favor del contratista, sin intereses ni actualización, indexación o repotenciación alguna.

Si el adjudicatario optara por contratar un seguro de caución, el mismo deberá ser otorgado por una compañía aseguradora y mediante una póliza autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación:

- Indicador patrimonial “C” (Créditos/Activos): menor o igual a 38,79.
- Indicador patrimonial “D” [(Dispo. + Invers.) / Deudas con Aseg.]: mayor o igual a 136,50.
- Indicador patrimonial “E” [(Dispo. + Invers.) / (Deudas con Aseg. + Comp. Técn.)]: mayor o igual a 103,83.

La entidad aseguradora responderá ante el mero incumplimiento del Contratista a sus obligaciones derivadas del contrato que se suscriba, sin necesidad de una previa interpelación judicial o prejudicial o acción judicial contra los bienes de éste.

La póliza deberá autenticarse por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio en caso de ser de jurisdicción ajena a la de la Provincia de Buenos Aires.

Si el adjudicatario optara por la constitución de derecho real de hipoteca, la misma deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

- Constituirse a favor de la Municipalidad de Tandil;
- Conceder a Municipalidad de Tandil 1º grado de preferencia;

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

- Podrá constituirse sobre inmueble de titularidad dominial del adjudicatario o de un tercero.
- El inmueble deberá tener un valor venal real, establecido por tasación oficial efectuada por el Municipio, equivalente, al menos, al total de la suma que se adelante por el Anticipo Financiero.
- El inmueble deberá situarse en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. En caso que se ofreciere un inmueble situado en otra jurisdicción, el Municipio tendrá derecho a desestimar la garantía.
- El inmueble gravado no podrá ser dado en hipoteca para garantizar otros créditos del adjudicatario o del tercero titular mientras esté vigente esta garantía.
- Si durante la vigencia de la hipoteca el inmueble fuera embargado o subastado y su producido no alcanzara a cubrir el Anticipo Financiero o su remanente, el Municipio tendrá derecho a exigir la constitución de una nueva Garantía de Anticipo Financiero, a través de alguna de las modalidades de garantía previstas en el art. 25.B., en cuyo caso la nueva garantía deberá otorgarse en el plazo de 30 días de requerida. Vencido el mismo sin que la nueva garantía se hubiera constituido, el Municipio podrá declarar la resolución del contrato por incumplimiento del contratista.
- Cualquiera sea la modalidad en que se constituya u otorgue la Garantía de Anticipo Financiero, permanecerá en vigencia hasta que se haya ejecutado en obra el pago anticipado, lo que se determinará por certificación que al efecto expida la Dirección de Obras Públicas. Su monto podrá ser reducido progresivamente siempre y cuando la naturaleza de la garantía convenida lo permita y en la medida del grado de avance de la obra.
- La Garantía de Anticipo Financiero que se otorgue y constituya no implica limitación alguna de la responsabilidad contractual en que pudiera incurrir el Contratista. El Municipio puede ejecutar la garantía a cuenta del mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a exigir el resarcimiento integral derivado del o los incumplimientos del Contratista, incluso los que reconozcan su causa en el nuevo contrato que deba celebrar el Municipio para la continuación de las obras, o por la ejecución directa de ésta.

Para la ejecución de la Garantía de Oferta, de Contrato o de Anticipo Financiero se observarán, sin perjuicio de otras que pudieren corresponder, las siguientes reglas:

El Municipio determinará por resolución fundada la obligación pendiente de cumplimiento y su valor, la que importará intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución de la garantía.

Se notificará dicha resolución al Contratista en el domicilio constituido.

En el caso de que el Contratista no pague, el Municipio decidirá por resolución fundada la ejecución de la garantía, la que se llevará a cabo en la forma que corresponda a la modalidad de fianza

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

adoptada por el Contratista. Los recursos o impugnaciones administrativos o judiciales que se dedujeren contra cualquiera de las resoluciones antes mencionadas o la intimación, no suspenderán la exigibilidad de la garantía.

ARTÍCULO 37: RECAUDOS PREVIOS: Previo a la firma del contrato administrativo de obra, el Proponente deberá presentar en el término que al efecto se señale, la siguiente documentación:

- La Garantía de contrato establecida en el artículo anterior;
- Contrato y locación de servicios con el Representante Técnico de la Obra con incumbencias en la misma;
- Contrato con el responsable del área de Higiene y Seguridad del trabajo que la empresa tenga contratado.
- Plan de trabajo propuesto.

ARTÍCULO 38: FIRMA DEL CONTRATO: El Adjudicatario deberá concurrir, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, a firmar el Contrato Administrativo de Obra Pública dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la fecha en que sea formalmente citado.

En caso de que la Adjudicataria no concurriera a firmar el Contrato dentro del plazo estipulado, incurrirá en multa equivalente al cinco por ciento (5%) del depósito de garantía por mantenimiento de oferta fijado en el artículo 18 del presente Pliego, por cada día hábil de demora. Si transcurridos veinte (20) días hábiles desde el vencimiento del plazo, no se hubiere formalizado el Contrato, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, con pérdida del depósito de garantía que se hubiere constituido. Firmado el Contrato se procederá a la devolución de las garantías de oferta de las firmas no adjudicatarias.

ARTÍCULO 39: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del contrato:

- El presente Pliego de Bases y Condiciones, así como las aclaraciones o instrucciones dadas a conocer a los interesados.
- La propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.
- El plan de trabajos y plan de acopio de materiales y/o elementos, si fuere exigido.
- Las órdenes de servicios que por escrito le impartan al Contratista.
- Los análisis de precios, cálculos métricos y presupuestos, según se haya solicitado o no;
- Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por la

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

- Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscrito.
- Los planos de obra.

ARTÍCULO 40: CESION DEL CONTRATO: Firmado el Contrato, el Contratista no podrá cederlo ni transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin la previa aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad, y siempre de acuerdo con las exigencias que para esos supuestos establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. Para autorizar la cesión o transferencia del contrato deberán observarse los siguientes requisitos:

Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Licitadores, tenga capacidad técnico financiera suficiente para la totalidad del contrato original y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la obra que falta ejecutar;

Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del cuarenta por ciento (40%) del monto de los trabajos, según certificación que al efecto expida la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantía de cualquier naturaleza que hubiera presentado o se le hubiera retenido al adjudicatario cedente.

La cesión efectuada por el adjudicatario sin la previa autorización otorgada por la Municipalidad implicará la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, sin necesidad de previa interpelación judicial ni extrajudicial.

ARTÍCULO 41: PLAN DE TRABAJO: Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo, el que regirá estrictamente una vez aprobado por la Municipalidad. Vencido el plazo antedicho se le aplicará al Contratista una multa del uno por ciento (1%) del depósito de garantía de Contrato por cada día de demora. Esta deberá hacerse efectiva en el acto de presentación del plan de trabajos definitivo sin cuyo requisito no será aceptado.

Se presentará además, una nómina detallada del equipo a utilizar en obra, con marca, modelo, propietario y fecha de ingreso a la misma. La Municipalidad podrá exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del plazo contractual.

ARTÍCULO 42: REPLANTEO DE LA OBRA: La Municipalidad solicitará al Contratista iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo. Si el Contratista no concurriera a la primera citación, se hará pasible de la multa fijada en el artículo anterior de estas cláusulas. De no concurrir a la segunda citación se rescindirá el Contrato con la pérdida del total del depósito de

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

garantía.

ARTÍCULO 43: FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO: Desde la fecha del primer replanteo, corren los términos para iniciar, ejecutar y terminar la obra. Se labrará el Acta de Inicio de la obra el día que se realiza el primer replanteo.

ARTÍCULO 44: FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS: El Contratista deberá dar comienzo a los trabajos dentro del plazo de dos (2) días hábiles de la fecha de primer replanteo. El incumplimiento de ésta, hará pasible al Contratista de una multa establecida en el artículo 82 del presente Pliego.

ARTÍCULO 45: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: Se fija como plazo para la ejecución total de la obra objeto de esta licitación el de **ciento veinte (120) días** corridos a contar desde el Acta de Replanteo de Obra señalada en el artículo 42.

El incumplimiento del plazo establecido hará pasible al Contratista de una multa equivalente al cero uno por ciento (0,1%) del monto contractual, por día de demora, actualizado.

ARTÍCULO 46: INSPECCION DE LAS OBRAS: La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la Inspección que designe la Municipalidad. El Contratista y a su exclusiva cuenta, pondrá a disposición de la Dirección Técnica el personal, material, medios de movilidad y elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, tomas de muestras, ensayos e inspecciones en general, desde el día del inicio de la obra hasta su Recepción Definitiva.

ARTÍCULO 47: VIGILANCIA, SEGURIDAD Y ALUMBRADO DE LA OBRA: Incumbe al Contratista la responsabilidad desde que se inicia hasta el final de la obra, respecto de la vigilancia y seguridad continua del predio, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de terceros, colocando luces y señales de peligro y adoptando todas las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, sin perjuicio de lo que dispusiere específicamente el Pliego de Bases y Condiciones, o en su defecto, lo que ordene la Inspección en caso de evidente falta de medidas al respecto.

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se prevén.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

Los gastos provenientes de energía eléctrica, para el alumbrado y fuerza motriz, así como de agua para la construcción, serán por cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 48: SEÑALIZACION DE DESVIOS: En los lugares donde sea necesario el desvío del tránsito, provocado por la ejecución de las obras, el mismo deberá ser señalizado en forma adecuada de día y de noche con letreros reglamentarios, pintado con material reflectante. Dichos letreros deberán ser colocados en los lugares y en la cantidad que exija la Inspección y con las leyendas indicadas por la misma.

ARTÍCULO 49: APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: Cuando exista la imposibilidad en plaza de conseguir materiales exigidos por la documentación y el Contratista no haya formulado ninguna observación por escrito con una anticipación mayor de setenta y dos (72) horas al inicio de obra, el Contratista no tendrá derecho a alegar esa circunstancia durante la ejecución de la obra para provocar un cambio de materiales.

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha circunstancia, para que al llegar el momento de su empleo, no se produzcan por la falta de los mismos, entorpecimientos en la marcha de los trabajos. Tal obligación debe cumplimentarse en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos a partir del momento de la notificación mediante Orden de Servicio impartida por la correspondiente Inspección.

ARTÍCULO 50: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR: El Contratista tendrá en la obra cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieren para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua a los mismos.

Si por el lugar de realización de la obra no fuere posible o no se requieran tales construcciones provisionales, la Inspección dispondrá lo conducente al respecto.

ARTÍCULO 51: CARTEL DE OBRA: El Contratista estará obligado a colocar un (1) cartel indicador de la obra en el lugar señalado por la Inspección. Dicho letrero se hará siguiendo las estipulaciones de la Municipalidad.

ARTÍCULO 52: MATERIALES RECUPERABLES: En todos los casos, los materiales, equipos y elementos provenientes de demoliciones, reemplazos, reacondicionamientos o sobrantes de la provisión de los distintos ítems de la presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, limpios y ordenados.

La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser depositados.

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

ARTÍCULO 53: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES - ARREGLOS DE

DESPERFECTOS: Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes o aledañas, estará a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción, en la propuesta que se acepta:

La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos se produzcan en las obras o instalaciones existentes, aledañas a la obra;

La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir obras nuevas con las existentes;

La provisión de todo material o ejecución de trabajos al objeto antes dispuesto, será de calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes.

ARTÍCULO 54: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin, y en consecuencia por todos los desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la Recepción Definitiva.

La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, defectos o deterioros, y éste deberá proceder a su reparación o arreglo en el plazo en que se le señale; vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del Contratista, descontando el importe de los mismos del depósito de garantía, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder según las circunstancias del caso.

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque los planos y las Especificaciones Técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

ARTÍCULO 55: INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS: El Contratista tiene la obligación de efectuar todas las gestiones o trámites ante empresas nacionales, provinciales o municipales y entidades privadas que poseyeran Instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución de los trabajos, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma del contrato.

Antes de iniciar las obras, y con la debida anticipación, el Contratista iniciará las gestiones para la remoción de obstáculos naturales y/o artificiales y reconstrucción de las instalaciones superficiales

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

o subterráneas, visibles o no, que interfieran con la obra contratada, se encuentren o no consignadas en los planos, no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar la exactitud de los datos consignados en los mismos, para lo que deberá realizar todas las gestiones conducentes a tal fin. No podrá exigir pago alguno por estos conceptos.

Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no resulte atribuible a su falta de diligencia. Agotada la última instancia posible del trámite, acreditará esta situación ante la Dirección, mediante una copia de cada comunicación presentada a los prestatarios o usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la interferencia o imprevisto, con su acuse de recibo y observaciones si las hubiere.

El Contratista será el único responsable de los desperfectos que la remoción y reconstrucción de las interferencias produzcan en la obra contratada.

Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia en la ejecución de la obra a su cargo, o por deficiencia en las averiguaciones a que se refiere éste artículo, ocasionados en las instalaciones que interfieran con la misma.

ARTÍCULO 56: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN LA OBRA: El Contratista o su Representante, autorizado y aceptado por la Municipalidad, deberá hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo pena de suspenderse las tareas.

La aceptación de un Representante no releva al Contratista de la vigilancia periódica de los trabajos, debiendo estar presente cuando así lo exigiese la Inspección.

ARTÍCULO 57: COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: El Contratista comunicará a la Inspección, las observaciones que le merezcan la marcha de los trabajos, en el libro de Notas de Pedidos que llevará al efecto, según se dispone a continuación:

- La Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido debidamente foliado por triplicado.
- El Libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección.
- Las Notas de Pedido se extenderán con lápiz tinta o bolígrafo preferiblemente en letra de imprenta y con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase de duda en su interpretación y alcance.
- El contratista entregará a la Inspección el duplicado y el triplicado de las Notas de Pedido, considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en que la Inspección acuse recibo en el Original, salvo que el Contratista emplee otro modo de notificación auténtica, cierta y fehaciente.

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

- La Inspección deberá considerar y resolver las Notas de Pedido dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la recepción de las mismas, siempre que se encuentre dentro de sus atribuciones la decisión acerca del problema planteado. La no resolución dentro del plazo señalado, faculta al Contratista para recurrir ante la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.
- La Inspección en todos los casos archivará en una carpeta especial, todas las Notas de Pedido, como elemento de consulta para cualquier problema, a modo de registro de cuestiones planteadas por el Contratista.
- Cuando se produjere alguna divergencia entre el Contratista y la Inspección acerca de un problema planteado por Nota de Pedido, la Inspección deberá remitir de inmediato una copia de la misma a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

ARTÍCULO 58: ORDENES DE SERVICIO: Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado y sellado, denominado "Libro de Órdenes de Servicio" que permanecerá en su poder. Las Órdenes de Servicio deberán ser notificadas al Contratista o su Representante Técnico.

En caso de que el Contratista o su Representante Técnico se nieguen a notificarse, la Inspección le entregará una copia de la Orden, firmando en el original un testigo que dará fe que la copia se entregó, dejándose constancia de la negativa a notificarse, lo que producirá los mismos efectos que la notificación personal.

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato, que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario.

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del Contrato, podrá deducir reclamación fundada mediante Nota de Pedido, dentro del término de cinco (5) días hábiles a contar de la fecha de notificación de la Orden de Servicio.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto, aun cuando hubiere observado la orden o consignada reserva de derechos al pie de la misma y al tiempo de notificación.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

La reclamación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada o ratificada, sin perjuicio de las compensaciones que puedan corresponderle, si probare que las exigencias impuestas variaren las condiciones del contrato.

En caso de incumplimiento, se hará pasible el Contratista de las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones completo, pudiendo además la Municipalidad, mandar ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado de obra o mayores costos que se le extienda, y en su caso, subsidiariamente de los fondos de reparo o la garantía constituida.

ARTÍCULO 59: DISCREPANCIAS DE LA CONTRATISTA CON LA INSPECCION: Las divergencias que surgieran durante la ejecución de los trabajos serán salvadas en primer término en el ámbito de la Municipalidad y las decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y a la solidez y buena ejecución de los trabajos.

En ningún caso podrá el Contratista suspender las tareas ni aun parcialmente porque existan divergencias en trámite, bajo pena de aplicar las multas previstas en el artículo 82.

Transcurrido un lapso de 15 (quince) días corridos sin que se trabaje, podrá la Municipalidad rescindir el Contrato con pérdida de la garantía del mismo.

ARTÍCULO 60: PERSONAL DE OBRA: El mínimo de personal que se empleará en las obras será el que la Inspección considere necesario para dar cumplimiento al Plan de Trabajos aprobado.

Mientras dure la ejecución de las obras el setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo, del personal que trabaje en la misma, será de nacionalidad argentino, debiendo preferirse el radicado en la localidad.

ARTÍCULO 61: SEGURO POR ACCIDENTES DE TRABAJO: Es obligación del Contratista asegurar al personal de la obra en una A.R.T. reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el término de la ejecución de la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, invocando taxativamente los riesgos que cubre, reconociéndose su incapacidad total o parcial, asistencia médica, internación y medicación.

La póliza respectiva será presentada a la Municipalidad dentro de los treinta (30) días de iniciada la obra.

En el caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción de los plazos contractuales.

Toda modificación o renovación de póliza debe ser autorizada previamente por la Municipalidad.

Asimismo, el Contratista deberá presentar cuando le sea requerido, un certificado de la Compañía

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

de Seguros del monto de la Póliza a la fecha del requerimiento.

ARTÍCULO 62: APORTES A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES:

El Contratista es el único responsable del cumplimiento y observancia de la legislación laboral y de la seguridad social respecto de sus dependientes. Es a su cargo la obligación de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales, sea como obligado directo o como agente de retención, quedando obligado a ingresar los aportes y contribuciones exigibles con destino a organismos de seguridad social, aportes jubilatorios, obra social, aportes sindicales, fondo de desempleo y cualquier otro que pudiera corresponder.

La Municipalidad podrá requerir al Contratista, cuando lo estime oportuno, el número de Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores o la Libreta de Fondo de Desempleo o cualquier otra inscripción, registración o constancia que imponga la Ley 22.250 y sus modificatorias, las constancias de pago de las remuneraciones, los comprobantes de pago mensuales que acrediten haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes de la seguridad social y sindicales, la documentación que acredite haber dado cumplimiento con la cobertura de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, respecto de todo el personal ocupado en la obra, como asimismo al Decreto Nacional N° 1475/64 o los que con posterioridad se dictaren a ese respecto.

El Contratista deberá presentar la documentación pertinente en el plazo de diez (10) días de serle requerida.

En caso que el Municipio debiera afrontar, por cualquier causa, el pago de tales conceptos, sus recargos, intereses, multas e inclusive honorarios profesionales, el Contratista deberá reembolsarle los mismos con sus intereses desde que el pago hubiere sido hecho, pudiendo hacerse efectivo este reembolso de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de cobro que tuviere el Contratista.

ARTÍCULO 63: DISCIPLINA EN LA OBRA: El Contratista será responsable de la disciplina en la obra. La Inspección de la obra podrá ordenar por escrito al Contratista, el relevo de la obra del personal que por su incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos.

ARTÍCULO 64: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones de la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte del

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

subcontratista, personal de proveedores, o excusándose en el retraso por parte de la Inspección de entregarle detalles y planos, o en la comprobación de errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de calidad inferior a lo establecido en la documentación contractual, o de una mano de obra deficiente, o por imprevisión, o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o sus empleados, será deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección, en el plazo que ésta fije.

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implica la aceptación de las mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo siendo los gastos que se originan a cuenta de éste.

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos rechazados, la Municipalidad podrá hacerlos por sí o por otros y a cuenta del Contratista y sin intervención judicial.

ARTÍCULO 65: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: En caso de suspensión de los trabajos en forma injustificada por parte del Contratista, se le aplicará una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del monto contractual, actualizado por cada día de suspensión.

ARTÍCULO 66: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como así también de la mala fe, o falta de honestidad en el suministro o empleo de los materiales.

El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los daños producidos a las personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, quedando entendido que sobre ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.

El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra en el obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su exclusiva cuenta.

En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en su obrador o campamento.

El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de construcción, maquinarias o implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de todos

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

los gastos y costos y de cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de éstos. En caso de que esos reclamos prosperen, el Contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de cobro.

Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, electricidad, sanitarios, etc.) cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de los servicios.

ARTÍCULO 67: SUBCONTRATISTAS: El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada. Para hacerlo deberá obtener la previa conformidad de la Municipalidad.

Ninguna subcontratación autorizada eximirá al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato, la que se mantendrá como si las obras las hubiera ejecutado directamente. La Municipalidad no contrae ninguna obligación con los subcontratistas, aún autorizados.

ARTÍCULO 68: PLAZO PARA RECLAMACIONES: Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego, deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días hábiles de producido el hecho que las motive, o de notificada la resolución de que se trate. Si no lo hiciere perderá todo derecho.

La reclamación podrá fundársela al tiempo de su presentación o hasta diez (10) días hábiles inmediatos siguientes, debiendo el Contratista, en éste último supuesto, hacer reserva expresa del derecho al momento de interponer la reclamación. En caso contrario, se dará por decaído este derecho.

ARTÍCULO 69: PRÓRROGA DE PLAZOS: Cuando el Contratista se exceda en la iniciación o terminación de la obra, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que lo solicite expresamente y lo justifique en debida forma, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de la producción del hecho o causa que la motive, transcurrido el cual no se tomará en consideración.

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración, especialmente, las siguientes causas:

- Encargo de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras;

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

- Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas;
- Casos fortuitos o de fuerza mayor producidos sin culpa del Contratista;
- Dificultades insuperables para conseguir materiales;
- Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera.

La Inspección estará obligada a sustanciar el pedido de prórroga de inmediato y la resolución respectiva podrá ser dictada al tiempo del vencimiento o del término establecido para la Recepción Provisoria, o de decidirse, la paralización de la obra.

Será autoridad competente para resolver la prórroga la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, o el Departamento Ejecutivo según la naturaleza o importancia de la prórroga.

Se define como "día de lluvia" el período de veinticuatro (24) horas utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitación supere los cinco milímetros. Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un día al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la Inspección podrá propiciar la prórroga por los días que correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no laborables.

ARTÍCULO 70: MODIFICACIONES Y ADICIONALES: La Municipalidad podrá licitar o convenir al margen del contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.

Además podrá ordenarse al Contratista la ejecución de modificaciones que produzcan aumentos o reducciones de costos, o trabajos adicionales que no exceden del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, los que serán de realización obligatoria y se regirán por lo que disponga sobre la materia la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación.

El decreto que al efecto se dicte, deberá contar además el aumento o disminución del plazo contractual, entendiéndose en caso contrario que el plazo no ha sido modificado.

ARTÍCULO 71: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:

A. Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen aumentos o reducciones de ítems contratados dentro de los límites establecidos en el Artículo anterior, se pagarán de acuerdo con los

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

precios unitarios del Contrato; B. Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítems diversos a los contratados o trabajos adicionales no previstos en el Contrato, los nuevos precios se establecerán cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes.

Tanto en ese caso, como si ello no fuera posible, en los nuevos precios se discriminarán los materiales, mano de obra, incidencia del equipo, gastos generales, beneficios y cualquier otro rubro que corresponda considerar según el caso. Los precios que así se determinen corresponderán a la fecha de licitación y sufrirán en su oportunidad el reconocimiento de mayores costos que corresponda. La creación de nuevos ítems deberá autorizarse mediante Decreto Municipal.

De no llegarse a un acuerdo previo sobre los nuevos precios, el Contratista deberá ejecutar inmediata y obligatoriamente los trabajos si así lo ordenase el Departamento Ejecutivo, dejando a salvo sus derechos mediante manifestación expresa. En este caso, se le reconocerá al Contratista el costo real a precios promedios de plaza u oficiales si estuvieran fijados, con la aprobación o reparos que le merezca a la Dirección, la que supervisará como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa, sin perjuicio de la ulterior vía judicial.

A todos los efectos de este apartado B, las partes aceptan el quince por ciento (15%) de gastos generales y el diez por ciento (10%) de beneficios.

ARTÍCULO 72: FORMALIDADES PARA LA MEDICION DE LA OBRA: El Pliego de Especificaciones Técnicas podrá determinar las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la medición.

La medición se efectuará con la intervención de la Inspección de obra y el Representante Técnico del Contratista.

En caso de ausencia o disconformidad del Representante Técnico de la Empresa, se podrá extender de todas maneras el certificado de obra, con los resultados de la medición efectuada por la Inspección, pudiéndose con posterioridad, si correspondiere, realizar la rectificación inmediata, o diferir para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

En todos los casos se labrará un acta dejándose constancia de los elementos necesarios para la determinación de la obra realizada y se entregará copia de la misma al Contratista.

Cuando la medición de ciertas estructuras o partes de la obra puedan presentar dificultades, la

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

operación se realizará en el momento que indique la Inspección, labrándose el acta correspondiente. Estas mediciones no darán origen a un certificado de obra, pero serán tenidas en cuenta al tiempo de efectuarse la certificación del período correspondiente.

ARTÍCULO 73: CARACTER DE LOS CERTIFICADOS: Todos los certificados constituirán documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final de la obra, y ésta sea aprobada por la Municipalidad. Pero una vez extendidos no podrán ser modificados en sus montos, ni retenido su trámite de pago, salvo cesión o embargo de los derechos de cobro, notificados fehacientemente a la Municipalidad.

ARTÍCULO 74: GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada certificado de obra, de mayores costos, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de **Fondo de Reparación**. Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del Contratista en el periodo de conservación que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. Su devolución en el importe no afectado se efectuará después de la Recepción Definitiva.

El contratista podrá solicitar la sustitución de esta retención acompañando Póliza de Caucción por importe equivalente. La misma deberá constituir al garante en fiador principal pagador o codeudor solidario, con expresa renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión, y mantenerse vigente durante todo el plazo de mantenimiento de obra. Las firmas deberán autenticarse por escribano público y, en caso de ser de jurisdicción ajena a la Provincia de Buenos Aires, legalizarse por el respectivo Colegio.

ARTÍCULO 75: PAGO DE LAS OBRAS E INTERESES POR RETARDO: El Municipio se compromete a realizar pagos en relación a la cantidad de obra ejecutada, dentro de los **20 días** de presentado el correspondiente certificado mensual expedido por la contratista y aprobado por el área solicitante. Las obras se pagarán en cheque no a la orden, sobre la base de los certificados que presente el Contratista, una vez firmados por la Inspección y aprobados por las Autoridades Municipales.

El derecho a reclamo se extingue por el cobro de certificados realizados sin reserva ninguna, y la reclamación deberá siempre formularse por escrito para ser considerada.

ARTÍCULO 76: CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA: Una vez recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantía que se determina en el artículo 79, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, así como de todos los trabajos que se requieran para mantenerle en buen estado de utilización conforme a su

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

destino.

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra, de aquellas partes para las que se hayan efectuado Recepciones Parciales Provisorias.

Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes de uso indebido de la obra.

Si se comprobare que el Contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se lo intimará formalmente para que así lo haga, dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y cargo del Contratista.

Aun cuando se hubieren efectuado Recepciones Provisorias Parciales, el plazo de conservación de la obra se contará desde la fecha de la recepción total. Se considerará como fecha de Recepción Provisoria total, la fecha de la última Recepción Provisoria parcial, una vez concluida la obra y siempre que la naturaleza de la misma lo posibilite.

ARTÍCULO 77: SEGURO DE OBRA: La contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar daños al Municipio y a terceros, siendo responsable por los accidentes que ocurran a obreros, propiedades o personas, ya sea por culpa del personal por él contratado o por causas eventuales relacionadas con la obra. Estará a su cargo la reparación, indemnización y/o responsabilidad de los daños producidos.

ARTÍCULO 78: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: se permitirá en los términos del decreto 290/2021 de la Provincia de Buenos Aires a todo evento la estructura de ponderación de costos que integrara la formula base será la siguiente:

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS

Decreto 290/2021

INSUMO	FUENTE	SANEAMIENTO
Mano de obra	Art 15 Decreto 1295/2002 inciso a)	53%
Hormigón	Art 15 Decreto 1295/2002 inciso s)	2%
Aceros- Hierro Aletado	Art 15 Decreto 1295/2002 inciso m)	1%
Energía Eléctrica	SIPM. IPIB. Cod. CPC 17100-1	2%
Caños de PVC	Art 15 Decreto 1295/2002 inciso h)	16%
Equipo- Amortización de equipo	Art 15 Decreto 1295/2002 inciso j)	14%

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

Gastos Generales	Art 15 Decreto 1295/2002 inciso p)	9%
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	3%

100,00%

ARTÍCULO 79: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida en forma provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato y efectuadas las pruebas que se establezcan en las Especificaciones, labrándose el Acta en presencia del Representante Técnico, la Contratista o los testigos presentes, en caso de que aquellos no concurran a la citación efectuada con cinco (5) días hábiles de anticipación.

Aun cuando las obras no se encuentren terminadas con arreglo al Contrato, y solo faltara subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitación de las mismas, a juicio de la Dirección Técnica, podrá realizarse la Recepción Provisoria, dejándose constancia de ello en el Acta respectiva, para lo cual la inspección de obra fijará un plazo en días, a los efectos de su correcta terminación dentro del plazo de conservación y garantía.

En el Acta que se debe labrar, se hará constar que los trabajos se efectuaron de acuerdo al contrato, de las modificaciones que se hayan autorizado, las multas, observaciones, penalidades, etc. a que se haga pasible la Contratista; la duración total de las obras terminadas y la fecha efectiva de terminación de los trabajos a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

La Recepción Provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su ejecución hubiera regido plazos parciales, salvo que la Dirección Técnica autorice recepciones parciales cuando así lo considere conveniente.

El plazo de conservación o garantía, se empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria y en caso de haber existido Recepciones Provisorias Parciales, se tomará la fecha de la última.

ARTÍCULO 80: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurridos trescientos sesenta y cinco (365) días corridos desde la Recepción Provisoria de la obra, salvo que la naturaleza de la obra haga indicar en el Pliego de Bases y Condiciones un plazo distinto, y presentados por el Contratista los certificados de conservación respectivos, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las Instalaciones especiales que hubiera, a cuyo efecto

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

se harán las pruebas que la inspección estime necesarias.

La Recepción Definitiva no libera a la Contratista de la responsabilidad civil emergente del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 81: DEVOLUCION DE FIANZA CONTRACTUAL: La garantía de cumplimiento de Contrato o los saldos remanentes en su caso, le serán devueltos al Contratista dentro de los treinta (30) días corridos inmediatamente posteriores de aprobada la Recepción Provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo y una vez satisfecho las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de admitirse Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le devuelva la parte proporcional de la garantía contractual.

ARTÍCULO 82: DETERMINACION DE LAS MULTAS: Los porcentajes abajo fijados, se refieren en todos los casos al monto de Contrato actualizado, con las mismas pautas de actualización que se adopten para los certificados de obra.

- A los efectos de la aplicación de las multas se establecen los siguientes porcentajes:
- Por cada día de demora en la presentación de la Garantía de Contrato: 0,1%.
- Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 0,1%.
- Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 0,1 %.
- Por cada día de ausencia del Contratista en la Obra o del Representante Técnico: 0,1%.
- Por cada día de demora en el retiro del material rechazado: 0,1 %.
- Por cada día de demora en la entrega de la obra terminada, conforme al plazo establecido: 0,1 %.
- Por cada día de paralización de la obra, por causas imputables al Contratista conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: 0,1%.
- Por incumplimiento en la disposición sobre Seguro Obrero (por cada día de demora en la entrega de la póliza): 0,1 %.
- Por cada día de demora en la presentación de la documentación para la firma del Contrato: 0,1%.
- Por cada falta de limpieza en la obra, colocación de vallas o tareas inherentes: 0,1 %.
- Por cada día de demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio: 0,1 %.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

- Por cada infracción a lo especificado en las Cláusulas Técnicas Legales y Administrativas del Pliego de Bases y Condiciones: 0,1 %.
- Otros casos no previstos: 0,1 %

ARTÍCULO 83: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE OBRA: La garantía de obra, o su remanente, será devuelta dentro de los treinta (30) días corridos de efectuada la Recepción Definitiva, sin actualización ni intereses.

ARTÍCULO 84: RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIPROCAS: La rescisión del Contrato se ajustará en todos los casos, a lo establecido en la Ley 6021 y su Reglamentación.

La rescisión por culpa del Contratista será dispuesta por Decreto del Departamento Ejecutivo y comunicada por nota bajo recibo, telegrama colacionado o por cédula. Cuando fuera el Contratista quien rescindió, deberá comunicarlo por nota bajo recibo o telegrama colacionado indefectiblemente.

ARTÍCULO 85: LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DE LA OBRA: Una vez terminados los trabajos y previo a la medición final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas adyacentes, todo sobrante y desecho de materiales de cualquier especie, así como las construcciones provisorias.

ARTÍCULO 86: CONTRATACION DE SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO: La empresa adjudicataria de la obra deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 24.557 de Riesgos de Trabajo y sus modificaciones, y en particular la Resolución N° 51/97 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para empresas constructoras, y en tal sentido deberá:

Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa, firmando en original por el Profesional.

A la firma del contrato la Empresa deberá presentar la comunicación de inicio de Obra a la A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resolución 51/97, presentado ante la A.R.T., que será girado junto con el pliego de obra, a la Secretaría de Gobierno para ser presentado al Depto. de Higiene y Seguridad de la Municipalidad de Tandil.

Al iniciar la obra se deberá dar cumplimiento a la Resolución 231/96 y presentar el listado del personal que intervendrá en la obra, conformado por la A.R.T. y el Programa de Seguridad aprobado por la A.R.T.

Periódicamente se presentarán las bajas y las altas del personal de la obra comunicadas a la A.R.T. El Profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa deberá dejar constancia escrita de su presencia en la obra, como de las observaciones hechas en la misma.

Los Subcontratistas de diferentes especialidades, deberán cumplir con lo especificado en los puntos 2, 3 y 4, ya sea alcanzado por la Resolución 51/97 o por la Resolución 319/99 Art. 5°.

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

Toda persona de la Empresa, o Subcontratada por ésta que, por diferentes razones, no esté incluido en el listado de la A.R.T., deberá contar con un Seguro por Accidentes de Trabajo no colectivo. Esto será válido para el personal directivo de la Empresa que acceda a la obra, para los profesionales contratados (que no se encuentren en relación de dependencia con la contratista, lo que alcanza al mismo Responsable de Higiene y Seguridad), y para los Subcontratistas, Empresas unipersonales y toda persona que por cualquier motivo se encuentre trabajando en la obra.

ARTÍCULO 87: RESOLUCION DEL CONTRATO. REGLAS GENERALES: La resolución del contrato se ajustará a lo dispuesto por la Ley 6.021 y su reglamentación y a lo previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Legales. La resolución por culpa del Contratista será dispuesta por decreto del Departamento Ejecutivo y comunicada por nota bajo recibo, cédula de notificación, acta notarial, carta documento o telegrama colacionado.

ARTÍCULO 88: RESOLUCION POR QUIEBRA, LIQUIDACION O CONCURSO PREVENTIVO: La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso de acreedores del adjudicatario producirán de pleno derecho la resolución del contrato.

Dentro de un plazo de sesenta (60) días, contados desde la fecha del auto de quiebra, de liquidación sin quiebra, o de declaración de concurso, podrá la Municipalidad aceptar que otra persona propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscrita en la especialidad correspondiente del Registro de Proveedores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico- financiera para la ejecución del monto total de la obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato.

ARTÍCULO 89: RESOLUCION POR INCAPACIDAD O MUERTE: En caso de incapacidad o muerte del adjudicatario, la Municipalidad podrá resolver el contrato si dentro del plazo de noventa (90) días sus herederos o sus representantes legales, según corresponda, no la tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieran o suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnico financiera para cumplimiento del mismo.

También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas inscriptas en la especialidad correspondiente del Registro de Proveedores con la capacidad suficiente para el caso.

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

El mismo procedimiento podrá observarse cuando, adjudicada la obra, el adjudicatario falleciera o cayera en incapacidad antes de haberse firmado el contrato.

Si el Departamento Ejecutivo dispusiera la resolución por muerte o incapacidad del adjudicatario, abonará a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitirá retirar el plantel, útiles y materiales. En este caso se devolverán los depósitos de garantía no afectados o sujetos a condición.

Si conviniera a la Municipalidad el plantel, los útiles y materiales acopiados para la obra, podrá arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Comuna.

ARTÍCULO 90: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: La Municipalidad tendrá derecho además a resolver el contrato en los siguientes casos:

- A. Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato;
- B. Cuando el adjudicatario se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, para la iniciación de las obras;
- C. Cuando el adjudicatario no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio de la Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas, no pueda terminarse la obra en los plazos estipulados;
- D. Cuando el adjudicatario infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada;
- E. Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 15% del monto del contrato. Previamente, en los caso b) y c) deberá intimarse al Adjudicatario por Orden de Servicio, cédula o telegrama colacionado dirigido al domicilio constituido, para que inicie o acelere los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que a tales efectos se le fije.

Vencido el plazo de intimación, e iniciadas las actuaciones tendientes a la resolución, la Dirección dispondrá por Orden de Servicio la paralización de los trabajos tomando la posesión de la obra, equipos y materiales, debiendo en la disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual se formará inventario.

La comuna podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del adjudicatario.

ARTÍCULO 91: EFECTOS DE LA RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: Dispuesta la resolución del contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de estas por la administración.

La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente (previa valuación), de los equipos y materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma.

Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Municipalidad reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato.

Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones, el adjudicatario incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo se lo eliminará o suspenderá en el Registro de Proveedores de la comuna por el término que se fije y, en su caso, se comunicará al registro de licitadores del Ministerio de Obras Públicas.

Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 90, el adjudicatario perderá el depósito de Garantía de Contrato.

En todos los casos en que la responsabilidad del adjudicatario excediera el monto de los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre los equipos, los que se retendrán a este efecto, pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Municipalidad.

En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Departamento Ejecutivo dará traslado del hecho al Colegio de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 92: RESOLUCION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: El Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato en los siguientes casos:

- a) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más de seis (6) meses la ejecución de las obras;
- b) Cuando el adjudicatario se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta por ciento (50%) durante cuatro (4) meses como consecuencia de la falta de cumplimiento de la Municipalidad en la entrega de la documentación, o elementos a que se hubiere comprometido, según contrato;
- c) Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos, ni realice el replanteo cuando éste corresponda dentro del plazo fijado en el contrato, más una tolerancia

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

de treinta (30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra. En todos los casos, el adjudicatario intimará previamente a la Municipalidad a normalizar la situación, la que deberá hacerlo en el plazo de sesenta (60) días para los casos de los incisos a) y b) y de quince (15) días para el caso del inciso c). Una vez que se expida la Municipalidad sin normalizar la situación, o transcurridos los plazos establecidos, el adjudicatario tendrá derecho a resolver el contrato, para lo cual se requerirá una nueva comunicación fehaciente por la cual así lo disponga.

ARTÍCULO 93: EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: Producida la resolución del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

- Liquidación a favor del adjudicatario del importe de los materiales acopiados y los destinados a obra, en viaje o en elaboración, que sean de recibo.
- Transferencias sin pérdida para el adjudicatario de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución de la obra o indemnización.
- Si hubiere trabajos ejecutados, se efectuará la Recepción Provisional, debiendo realizarse la Definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado, cuando esta corresponda. • Liquidación a favor del adjudicatario de los trabajos realizados a los precios de contrato.
- Liquidación a favor del adjudicatario de los gastos generales comprobados y beneficios correspondientes al monto de obra que ha dejado de ejecutar.
- No se liquidará a favor del adjudicatario suma alguna por otros conceptos que los especificados en este artículo. La Municipalidad en el término de noventa (90) días practicará las liquidaciones a que se refiere este artículo. El transcurso del plazo se suspenderá cuando el adjudicatario no adjuntare los elementos probatorios que obraren en su poder y que le fueran requeridos.

ARTÍCULO 94: RESOLUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Será asimismo causal de resolución el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al adjudicatario la obra que hubiera ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a los precios de contrato.

ARTÍCULO 95: HALLAZGOS: De acuerdo a la Ordenanza N° 7772/99, el Representante Técnico de la Empresa Contratista será responsable de informar de hallazgos arqueológicos, paleontológicos o históricos, conforme a los artículos de la Ordenanza precitada. En tal caso, la Empresa adjudicataria de la obra quedará exenta del pago de multas por demoras en la ejecución de la obra. A tal fin, la Inspección de Obra certificará la tarea realizada hasta el momento del hallazgo y consecuentemente se paralizará la misma.

**LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS
2025 - 2026”**

FORMULARIO FDCS 01

Declaraciones Juradas de aceptar jurisdicción y de no estar impedidos de participar:

Quien suscribe,....., en
representación de, declaro bajo
juramento aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de Azul,
ante cualquier cuestión judicial que se suscite.

Asimismo, para participar de este proceso licitatorio juro no encontrarme/nos:

- Quebrado/s ni concursado/s,
- Inhabilitado/s por condena judicial;
- Habiendo incumplido contratos suscritos con la Municipalidad de Tandil;
- Suspendido/s o inhabilitado/s en el Registro de Proveedores de la Municipalidad;
- En estado de inhibición general de Bienes;
- Con pedido de Concurso de Acreedores o de Quiebra en trámite;
- Desempeñando el carácter de funcionario/s, empleado/s, contratado/s o cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal;

Licitación Pública:.....

Fecha:.....

Firma y aclaración oferente:.....

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS

Domicilio legal:

Calle:.....N°.....Piso.....Dpto.....

Localidad:.....

Provincia:.....Código Postal:.....

Domicilio especial en el Partido de Tandil:

Calle:.....N°.....Piso.....Dpto.....

Domicilio electrónico (e-mail):.....

Se tomarán como válidos los domicilios denunciados en la presente a los efectos de cursar todas las notificaciones pertinentes posteriores a la celebración del acto de apertura del proceso licitatorio de referencia.

El oferente se compromete a comunicar fehacientemente cualquier modificación que se suscite en el transcurso del proceso. De lo contrario, no podrá alegar ni efectuar reclamo alguno por no haberse anoticiado oportunamente.

Licitación Pública:.....

Fecha:.....

Firma y aclaración oferente:.....

**LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS
2025 - 2026”**

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

En el día.....del mes dede 2026, se ha presentado la Empresa
.....,
en realizando
la visita de obra, que le ha permitido conocer las características del lugar, de la obra propiamente
dicha, lugar de ubicación y vista general, a fin de organizar la ejecución de las tareas inherentes a la
realización de la misma.

Licitación:.....

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma Responsable Municipalidad

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

FORMULARIO DE LA PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA

Quien suscribe, _____ en
representación de _____ con domicilio constituido en la calle
_____ N° _____ de la ciudad de Tandil, atento a lo dispuesto en
el Código de Obras Públicas, habiendo examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones
Legales de la obra: **LICITACION PUBLICA 03-01-26 ; Obra: Ampliación de redes de agua y cloaca
en diferentes calles FOS 2025 – 2026, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 14/100 (\$225.868.850,¹⁴)** y habiendo recogido en el lugar los
datos necesarios, se compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la Memoria
Descriptiva y el Pliego de Bases y Condiciones Legales los trabajos allí detallados, por la suma de
pesos _____

_____ (\$.....)

Acompaña comprobante de garantía de oferta por el importe de pesos _____
_____ (\$.....).

Declara conocer todos los términos del legajo, el lugar y características donde se ejecutarán las obras,
comprometiéndose a entregar lo solicitado según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

PLAZO DE ENTREGA: 120 días corridos.

FECHA:.....

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO PARA PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA

MUNICIPALIDAD DE TANDIL

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

OBRA: EXTENSION DE LA RED DE AGUA Y CLOACAS DIVERSAS CALLES AÑO 202_2026

Nº	DESIGNACION	UNIDAD	Cantidad	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Excavación Suelo Tipo OS-A, retiro suelo sobrante relleno, compactación y limpieza final	m3	1508.00	\$	\$
2	Excavación Suelo Tipo OS-B, retiro suelo sobrante relleno, compactación y limpieza final	m3	779.11	\$	\$
3	Colocación de cañerías y terminación final				
3.1	Cloacas				
	La Pastora 1200 (av)	m	130		
	La Pastora 1300 (ci)	m	60		
	Av. Cabildo al 1600 (vi)	m	145		
	Del Libertador al 600 (av)	m	78.95		
	Hno. Cristónomo 100	m	134		
	Fortineros al 300 (av)	m	143.85		
	Pavon al 900 (av)	m	155		
	Primera Junta al 2900 (vp)	m	143.85		
	Barifi 700 v.p	m	80		
	Dante Alighjieri 400	m	100		
3.2	Agua				
	Los Aromos al 700	m	143.85		
	Picheuta al 300 (av)	m	130		
	Picheuta al 0 (av)	m	255		

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

	Av. Juan B. Justo al 00 (vi)	m	60		
	Av. Juan B. Justo al 100 (vi)	m	154		
	Ijurco 2800 (av)	m	143.85		
	Hno Crisostomo 100		200		
	Santa Cruz 1800 - 1900 - 2000	m	719.25		
	Suarez Garcia 900	m	81		
	Jujuy 600 y 700	m	286		
4	Colocación de Bocas de Registro, ejecución de losas y terminación.	un	15		
5	Rotura y reparación de pavimento.	m3	48		\$
	SUMA TOTAL				\$

SON PESOS: (en letras):

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

OFERTA ALTERNATIVA OPCIONAL
ANTICIPO FINANCIERO DE HASTA EL 20%

El que suscribe con domicilio legal en la calle Nº de esta ciudad, atento a lo dispuesto en el Código de Obras Públicas, habiendo examinado los Planos y el Pliego de Bases y Condiciones de la obra **LICITACION PUBLICA 03-01-2026 ; Obra: Ampliación de redes de agua y cloaca en diferentes calles FOS 2025 – 2026, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 14/100 (\$225.868.850,¹⁴)** y habiendo recogido en el terreno los datos necesarios, se compromete a efectuar de conformidad a los lineamientos de la Memoria Descriptiva y demás especificaciones técnicas del Pliego, los trabajos allí detallados, por la suma de pesos.....

(\$.....) solicitando **ANTICIPO FINANCIERO DE UN..... % (hasta un 20%)** equivalente a PESOS

.....(\$.....); monto que será respaldado a través de:....., sujeto a aprobación por parte del Municipio.

PLAZO DE ENTREGA: 120 días corridos
Tandil..... de..... de 2026

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

**CÓMPUTO Y PRESUPUESTO PARA PROPUESTA ALTERNATIVA (OPCIONAL) CON
ANTICIPO FINANCIERO DE HASTA UN 20%**

MUNICIPALIDAD DE TANDIL

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

OBRA: EXTENSION DE LA RED DE AGUA Y CLOACAS DIVERSAS CALLES AÑO 202_2026

Nº	DESIGNACION	UNIDAD	Cantidad	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Excavación Suelo Tipo OS-A, retiro suelo sobrante relleno, compactación y limpieza final	m3	1508.00	\$	\$
2	Excavación Suelo Tipo OS-B, retiro suelo sobrante relleno, compactación y limpieza final	m3	779.11	\$	\$
3	Colocación de cañerías y terminación final				
3.1	Cloacas				
	La Pastora 1200 (av)	m	130		
	La Pastora 1300 (ci)	m	60		
	Av. Cabildo al 1600 (vi)	m	145		
	Del Libertador al 600 (av)	m	78.95		
	Hno. Cristónomo 100	m	134		
	Fortineros al 300 (av)	m	143.85		
	Pavon al 900 (av)	m	155		
	Primera Junta al 2900 (vp)	m	143.85		
	Barifi 700 v.p	m	80		
	Dante Alighjieri 400	m	100		
3.2	Agua				
	Los Aromos al 700	m	143.85		
	Picheuta al 300 (av)	m	130		

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

	Picheuta al 0 (av)	m	255		
	Av. Juan B. Justo al 00 (vi)	m	60		
	Av. Juan B. Justo al 100 (vi)	m	154		
	Ijurco 2800 (av)	m	143.85		
	Hno Crisostomo 100		200		
	Santa Cruz 1800 - 1900 - 2000	m	719.25		
	Suarez Garcia 900	m	81		
	Jujuy 600 y 700	m	286		
4	Colocación de Bocas de Registro, ejecución de losas y terminación.	un	15		
5	Rotura y reparación de pavimento.	m3	48		\$
	SUMA TOTAL				\$

SON PESOS: (en letras):

**LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS
2025 - 2026”**

Planos:


PLIEGO OFICIAL

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

NOTA 1: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros. La factibilidad es a nivel informativo debiendo el profesional actuante presentar el proyecto ejecutivo antes de iniciar la obra.
Las Bocas de Registro serán de polietileno con marco y tapa de fundición dúctil
Las redes a extender se deben ejecutar por vereda. Las calles deberán estar abiertas y cedidas al uso público.

NOTA 2: Previo a la solicitud del libre sanjeo deberá acompañar al presente un certificado de apertura de calle cedida según catastro y transitabilidad emitido por la dirección de vialidad

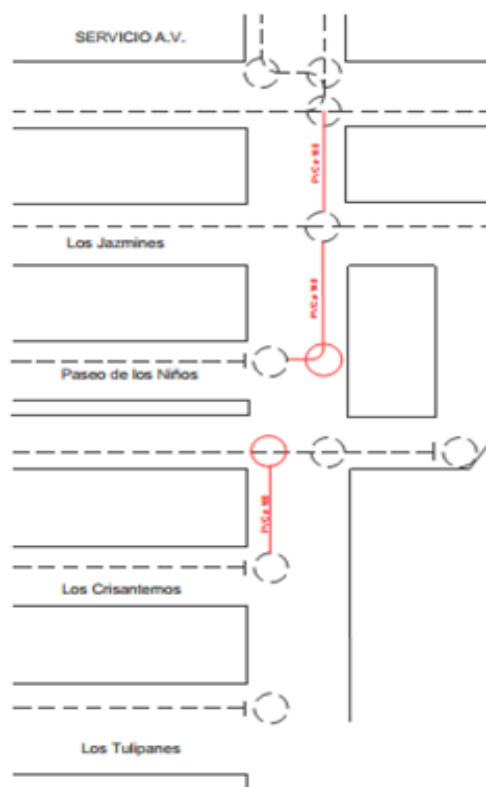

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° :

Fecha :

Aprobó :

RED DE CLOACAS

Calle : La Pastora 1200/1300 (ci)

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST, SIENDO EL MISMO A NIVEL INFORMATIVO, DEBIENDOSE CONSIDERAR COMO DEFINITIVO EL ESQUEMA QUE SURJA DEL PROYECTO DE OBRA PRESENTADO POR EL PROFESIONAL COMPETENTE.
SE DEBE PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”


<p>NOTA: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros.</p>			
 <p>NOTA : Para realizar la presente cuadra se deberá ejecutar Avda. Cabildo desde Avda. J.B.Justo hasta Pabón (v.p.)</p>			
DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL			
Carpeta N° : 2725 Fecha : 31/10/2013 Aprobó : c. p.	<table border="1"> <tr> <th style="text-align: center;">RED DE CLOACAS</th> </tr> <tr> <td> Calle : Avda. Cabildo al 1600 (v.p.) Entre : Pabón y Giaconi </td> </tr> </table>	RED DE CLOACAS	Calle : Avda. Cabildo al 1600 (v.p.) Entre : Pabón y Giaconi
RED DE CLOACAS			
Calle : Avda. Cabildo al 1600 (v.p.) Entre : Pabón y Giaconi			
<p>IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS</p>			

Firma y aclaración oriente

Firma y aclaración representante técnico

NOTA 1: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros. Los niveles de factibilidad son a nivel informativo debiendo el profesional actuante presentar el proyecto ejecutivo antes de iniciar la obra.
Las Bocas de Registro serán de polietileno con marco y tapa de fundición dúctil
Las redes a extender se deben ejecutar por vereda. Las calles deberán estar abiertas y cedidas al uso público.

NOTA 2: Previo a la solicitud del libre sanjeo deberá acompañar al presente un certificado de apertura de calle cedida según catastro y transitabilidad emitido por la dirección de vialidad

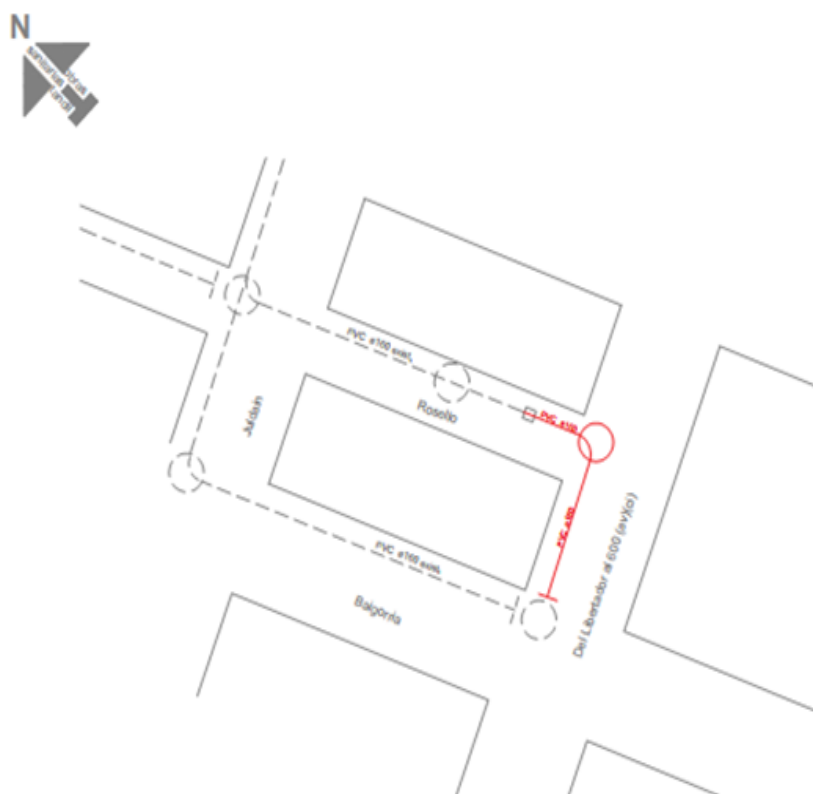

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° : 3623

Fecha : 27/04/2023

Aprobó :


RED DE CLOACAS

Calle : Del Libertador al 600 (av)(ci)

Entre: Baigorria y Rosello

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS. DEBERA PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

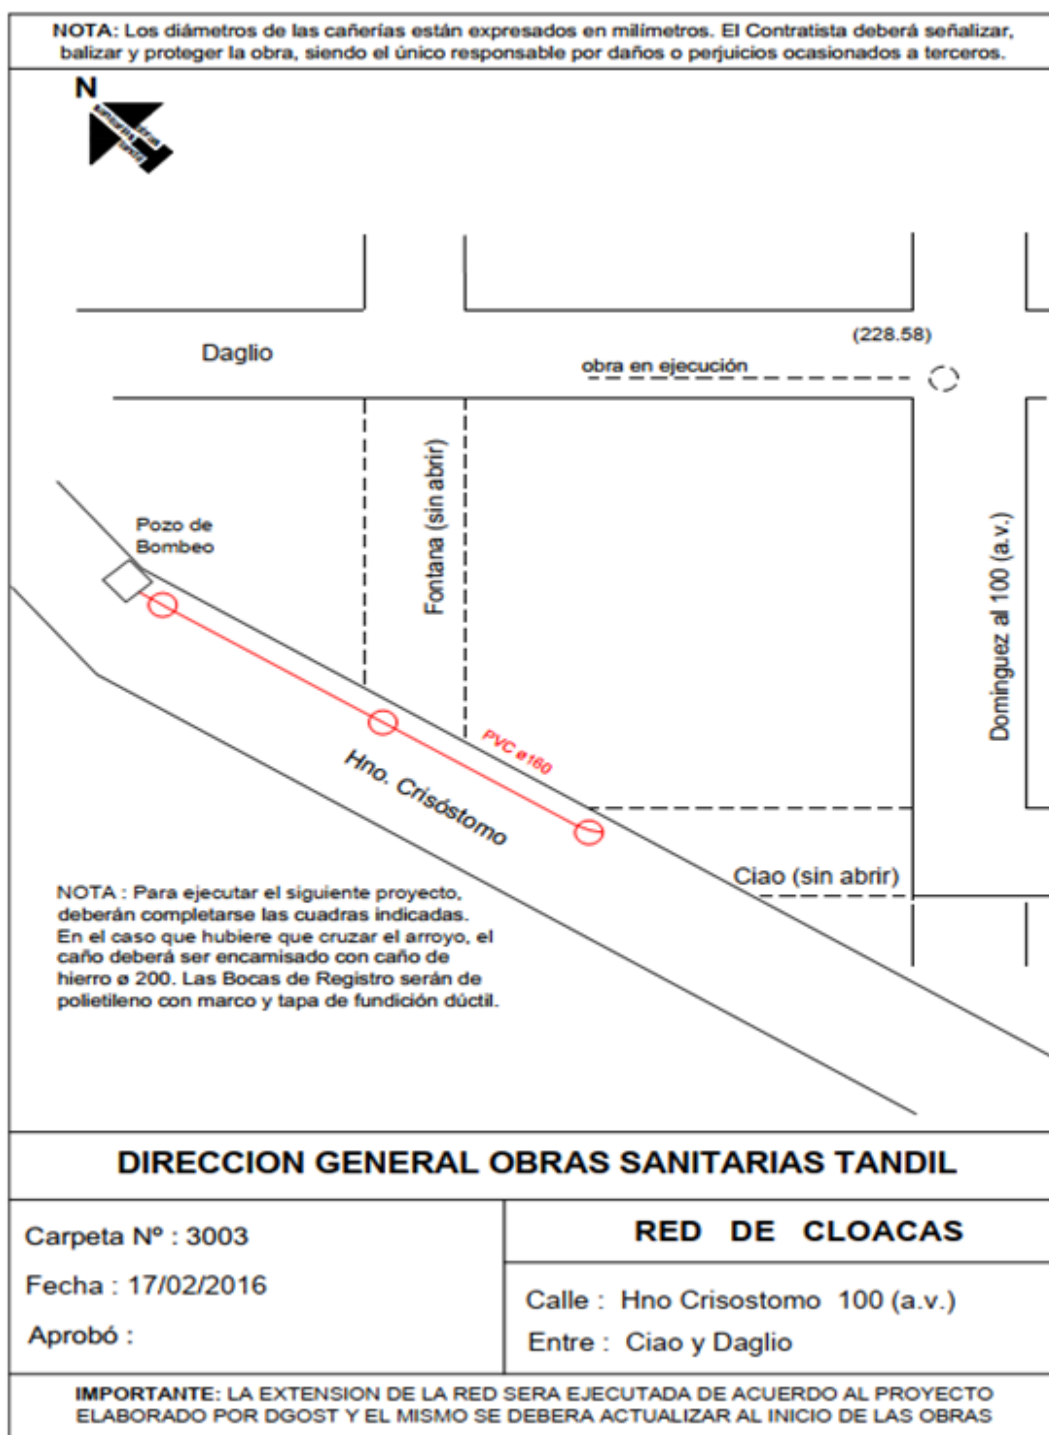

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

NOTA: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros. Los niveles de factibilidad son a nivel informativo debiendo el profesional actuante presentar el proyecto ejecutivo antes de iniciar la obra.
 Las Bocas de Registro serán de polietileno con marco y tapa de fundición dúctil



DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL


Carpeta N° : 3378 Fecha : 22-07-2020 Aprobó :	RED DE CLOACAS Calle : Fortineros al 300 (a.v.) Entre : Del Libertador y Uspallata
---	---

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

NOTA: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros.

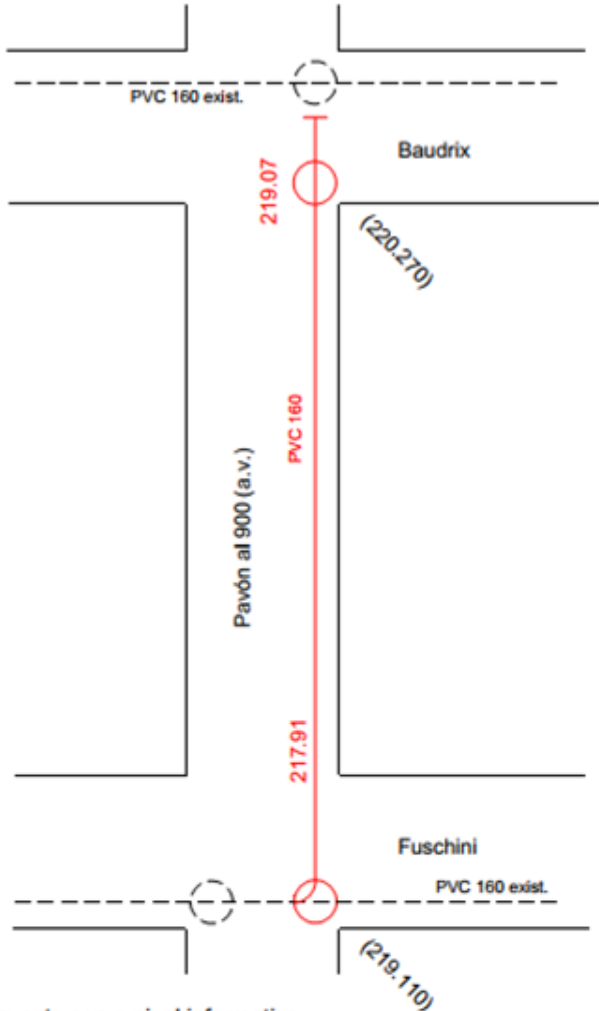

NOTA : Los niveles de proyecto son a nivel informativo debiendo el profesional actuante presentar el proyecto ejecutivo antes de iniciar la obra.
Las Bocas de Registro serán de polietileno con marco y tapa de fundición dúctil

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° : 3266

Fecha : 09-04-2024

Aprobó :


RED DE CLOACAS

Calle : Pavón al 900 (a.v.)

Entre : Fuschini y Baudrix

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS


LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”
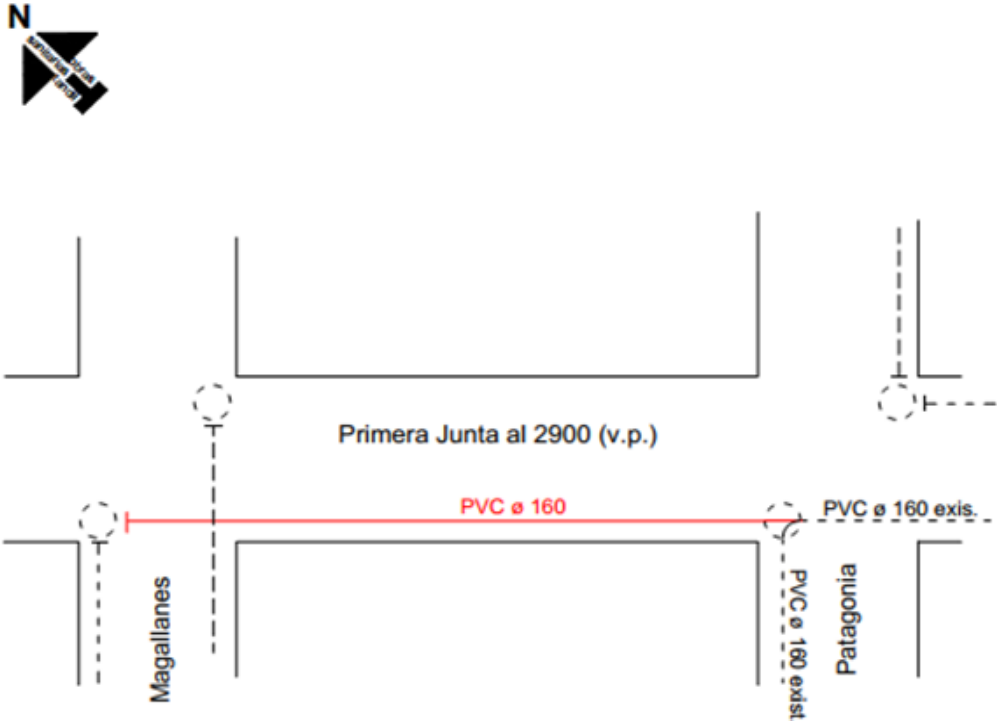
<p>NOTA 1: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros. Los niveles de factibilidad son a nivel informativo debiendo el profesional actuante presentar el proyecto ejecutivo antes de iniciar la obra.</p> <p>Las Bocas de Registro serán de polietileno con marco y tapa de fundición dúctil</p> <p>Las redes a extender se deben ejecutar por vereda. Las calles deberán estar abiertas y cedidas al uso público.</p> <p>NOTA 2: Previo a la solicitud del libre sanjeo deberá acompañar al presente un certificado de apertura de calle cedida según catastro y transitabilidad emitido por la dirección de vialidad</p>	
	
DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL	
Carpeta N° : 2673 Fecha : 19/04/2023 Aprobó :	RED DE CLOACAS Calle : Primera Junta al 2900 (v.p.) Entre : Magallanes y Patagonia
<p>IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS. DEBERA PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.</p>	

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

NOTA: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros.

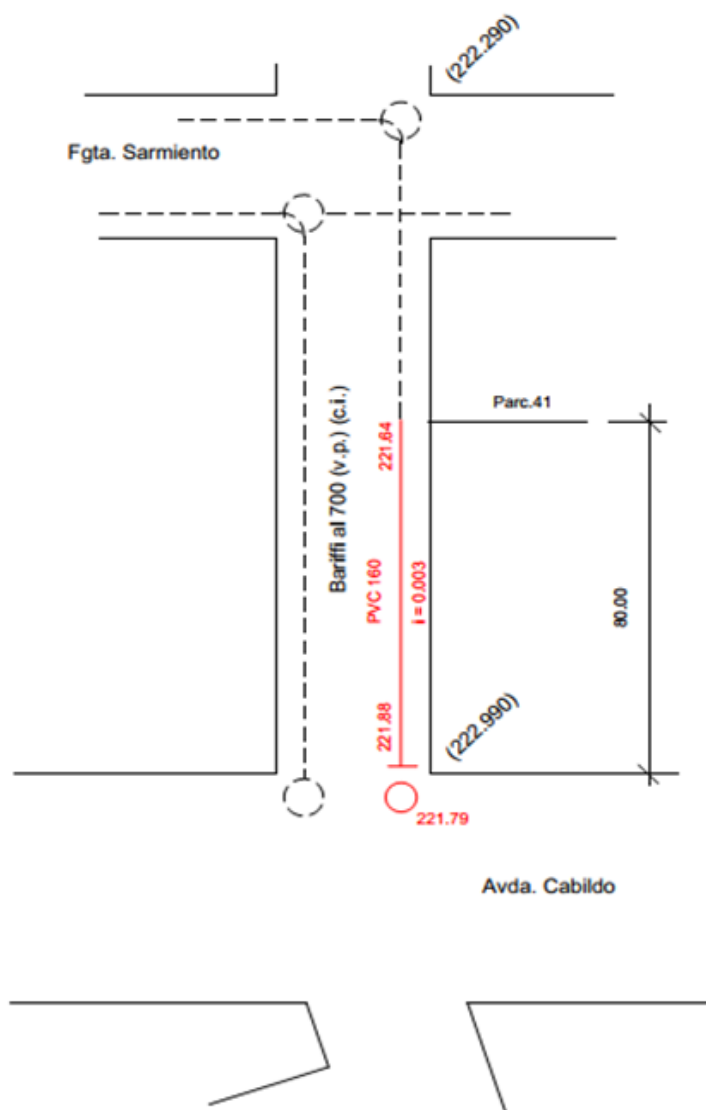

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° : 3165

Fecha : 21 -12-2020

Aprobó :

RED DE CLOACAS

Calle : Bariffi al 700 (v.p.) (c.i.)

Entre : Fgta. Sarmiento y Avda.Cabildo

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS


LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

<p>NOTA 1: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros. Los niveles de factibilidad son a nivel informativo debiendo el profesional actuante presentar el proyecto ejecutivo antes de iniciar la obra.</p> <p>Las Bocas de Registro serán de polietileno con marco y tapa de fundición dúctil</p> <p>Las redes a extender se deben ejecutar por vereda. Las calles deberán estar abiertas y cedidas al uso público.</p> <p>NOTA 2: Previo a la solicitud del libre sanjeo deberá acompañar al presente un certificado de apertura de calle cedida según catastro y transitabilidad emitido por la dirección de vialidad</p>							
							
DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL							
Carpeta Nº : Fecha : 25/07/2025 Aprobó :	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">RED DE CLOACAS</th> </tr> <tr> <td>Calle :</td> <td>D.Alighieri al 400</td> </tr> <tr> <td>Entre :</td> <td>Lunghi y Alonso</td> </tr> </table>	RED DE CLOACAS		Calle :	D.Alighieri al 400	Entre :	Lunghi y Alonso
RED DE CLOACAS							
Calle :	D.Alighieri al 400						
Entre :	Lunghi y Alonso						
<p>IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS. DEBERA PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.</p>							

NOTA 1: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros. Las redes se ejecutarán por la vía pública debiendo estar las calles abiertas y cedidas.

NOTA 2: Previo a la solicitud del libre sanjeo deberá acompañar al presente un certificado de apertura de calle cedida según catastro y transitabilidad emitido por la dirección de vialidad

NOTA 3: La ejecución de los empalmes estarán a cargo de la empresa, debiendo proveer los materiales necesarios a requerimiento d la Gerencia Operativa.

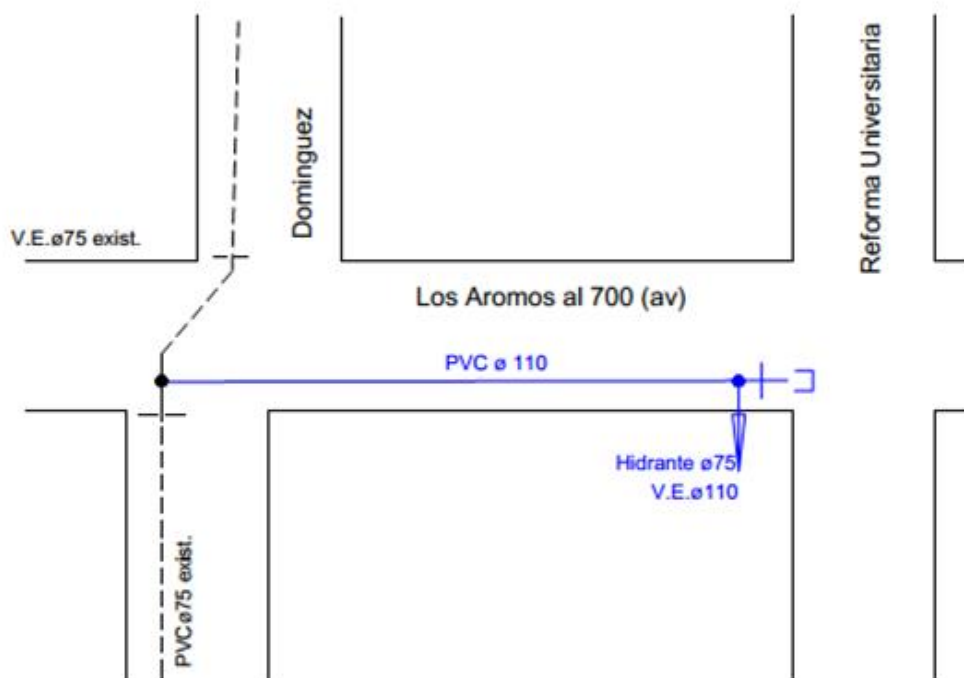

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° :

Fecha :

Aprobó :

RED DE AGUA

Calle : Los Aromos al 700

Entre : Dominguez y Reforma Universitaria

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST, SIENDO EL MISMO A NIVEL INFORMATIVO, DEBIENDOSE CONSIDERAR COMO DEFINITIVO EL ESQUEMA QUE SURJA DEL PROYECTO DE OBRA PRESENTADO POR EL PROFESIONAL COMPETENTE.

SE DEBE PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS


LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”



.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

NOTA: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros.

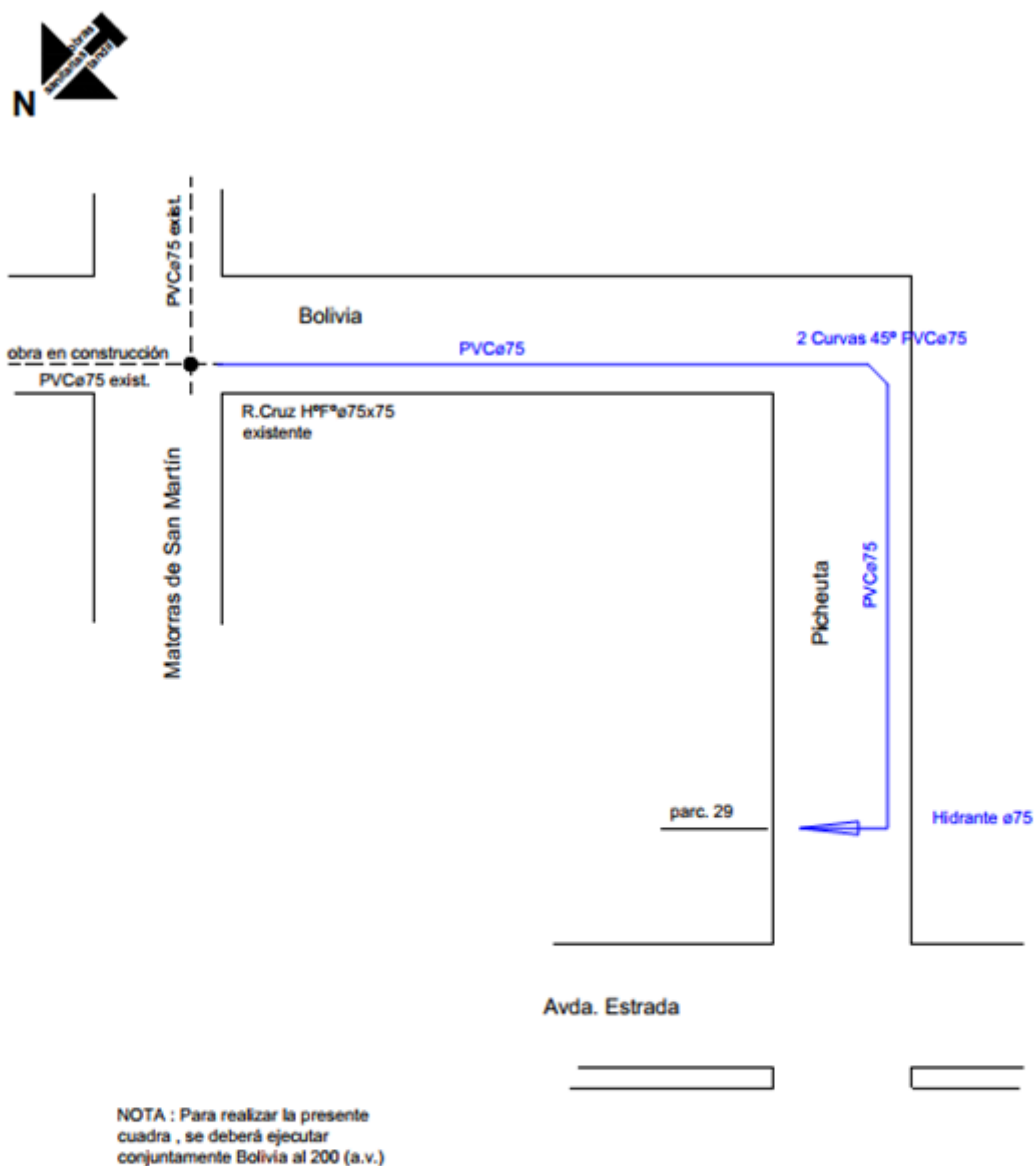

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° : 2845

Fecha : 22/10/2014

Aprobó : c. p.


RED DE AGUA

Calle: Picheuta al 00 (a.v.) (c.i.)

Entre: Bolivia y Avda. Estrada

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

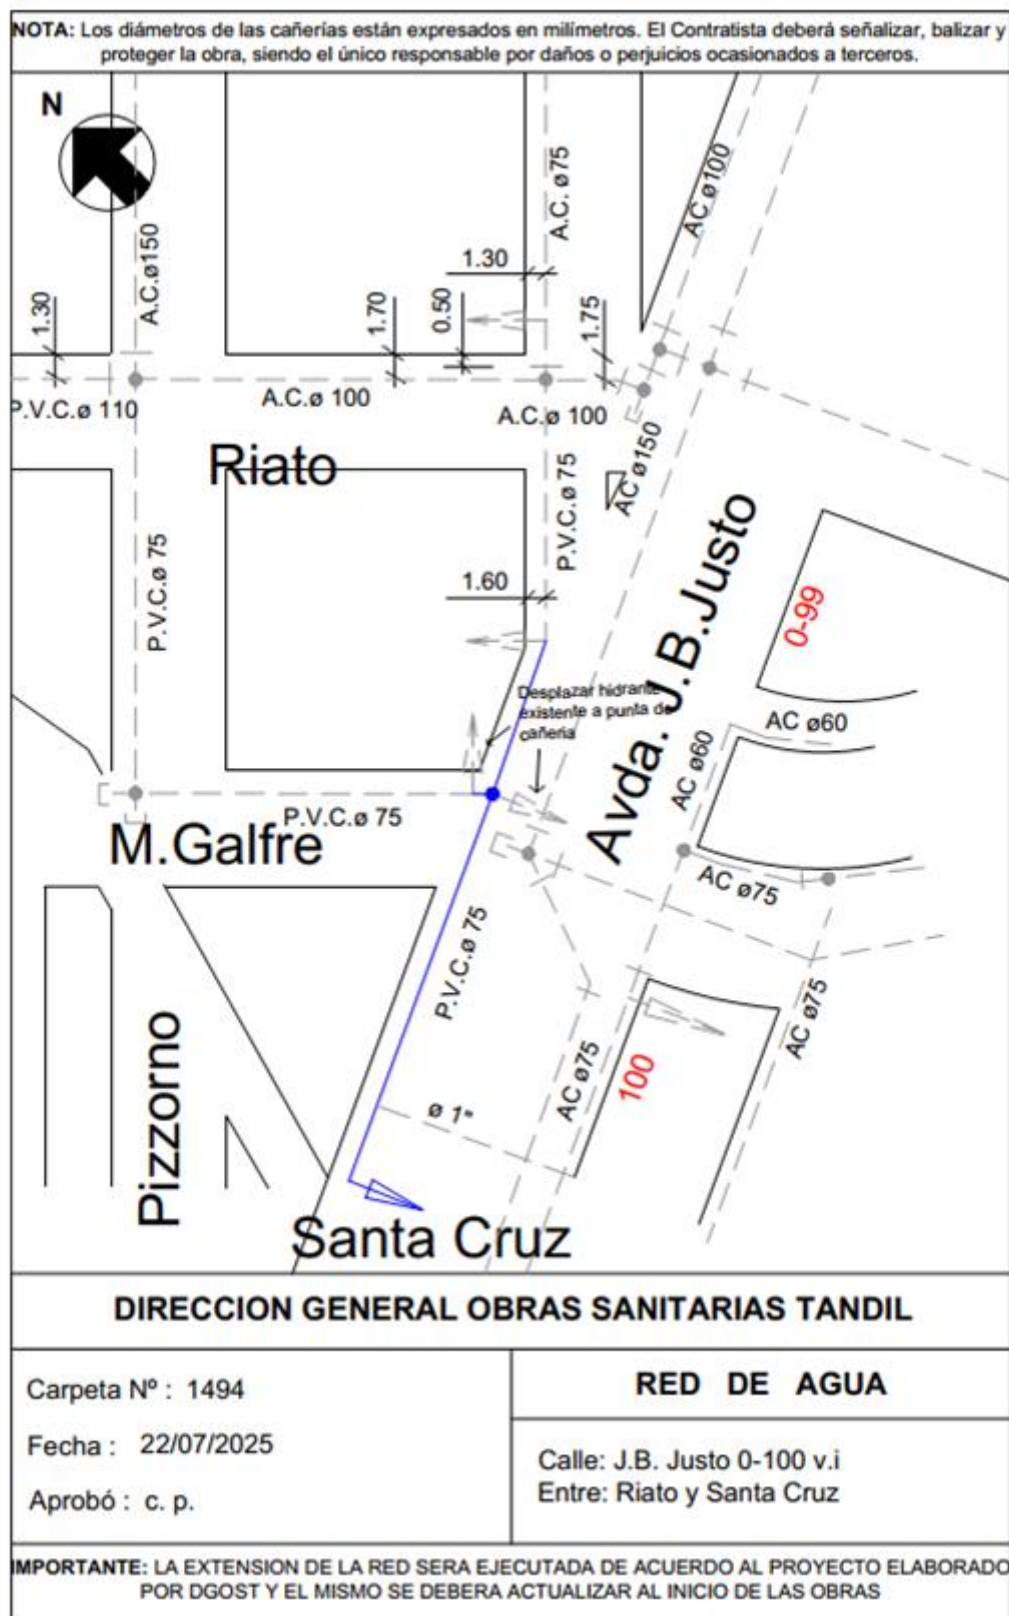


.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico

NOTA 1: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros. Las redes se ejecutarán por la vía pública debiendo estar las calles abiertas y cedidas.

NOTA 2: Previo a la solicitud del libre sanjeo deberá acompañar al presente un certificado de apertura de calle cedida según catastro y transitabilidad emitido por la dirección de vialidad

NOTA 3: La ejecución de los empalmes estarán a cargo de la empresa, debiendo proveer los materiales necesarios a requerimiento de la Gerencia Operativa.

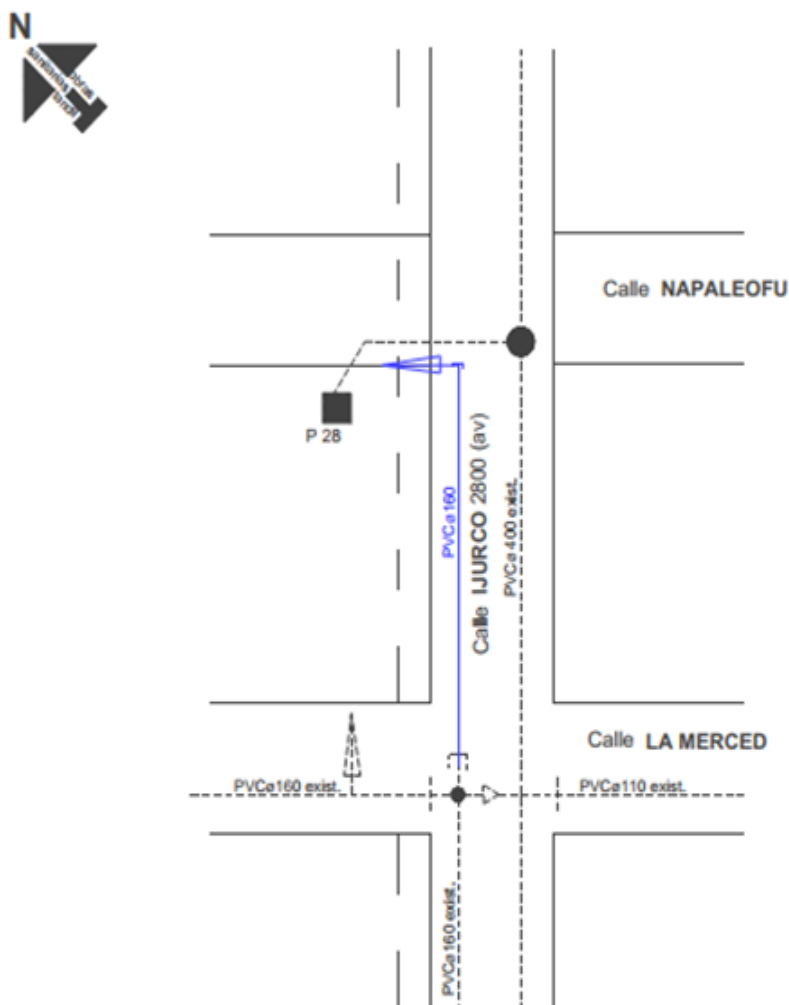

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° :

Fecha : 04 -05- 2023

Aprobó :

RED DE AGUA

Calle: Ijurco 2800 (av)

Entre: La Merced y Napaleuofú

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS. DEBERA PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

NOTA: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros.

Los empalmes a la red existentes deberán ser realizados por la contratista bajo la supervisión de gerencia operativa.

La contratista tiene prohibido manipular el cierre o apertura de válvulas existentes.

Las redes a extender se deben ejecutar por vereda. Se deberá verificar que las cañerías a empalmar se encuentren ejecutadas en vereda. Las calles deberán estar abiertas y cedidas al uso público.

La contratista deberá relevar todos los hechos existentes en obra, cualquier diferencia por error u omisión de no haber representado los mismos en el proyecto ejecutivo serán a exclusivo costo de la contratista.

Cualquier diferencia en obra por error u omisión por la falta de relevamiento de la contratista será a exclusivo cargo de la misma sin lugar a reclamo alguno.



DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° : -

RED DE AGUA

Fecha : 23/07/2025

Calle : Hno Crisostomo al 100 a.v

Aprobó :

Entre : Teresa de Calcuta y Cíao

IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS. DEBERA PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.

Firma y aclaración oferente

Firma y aclaración representante técnico

NOTA: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros.

Los empalmes a la red existentes deberán ser realizados por la contratista bajo la supervisión de gerencia operativa.

La contratista tiene prohibido manipular el cierre o apertura de válvulas existentes.

Las redes a extender se deben ejecutar por vereda. Se deberá verificar que las cañerías a empalmar se encuentren ejecutadas en vereda. Las calles deberán estar abiertas y cedidas al uso público.

La contratista deberá relevar todos los hechos existentes en obra, cualquier diferencia por error u omisión de no haber representado los mismos en el proyecto ejecutivo serán a exclusivo costo de la contratista.


Cualquier diferencia en obra por error u omisión por la falta de relevamiento de la contratista será a exclusivo cargo de la misma sin lugar a reclamo alguno.



DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° : -	RED DE AGUA
Fecha : 22/07/2025	Calle : Santa CRUZ 1800-1900-2000
Aprobó :	Entre : Azucena y La Pastora
IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS. DEBERA PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.	

LICITACION PÚBLICA 03-01-26 “Obra: Extensión de redes de agua y cloaca en diferentes calles –FOS 2025 - 2026”

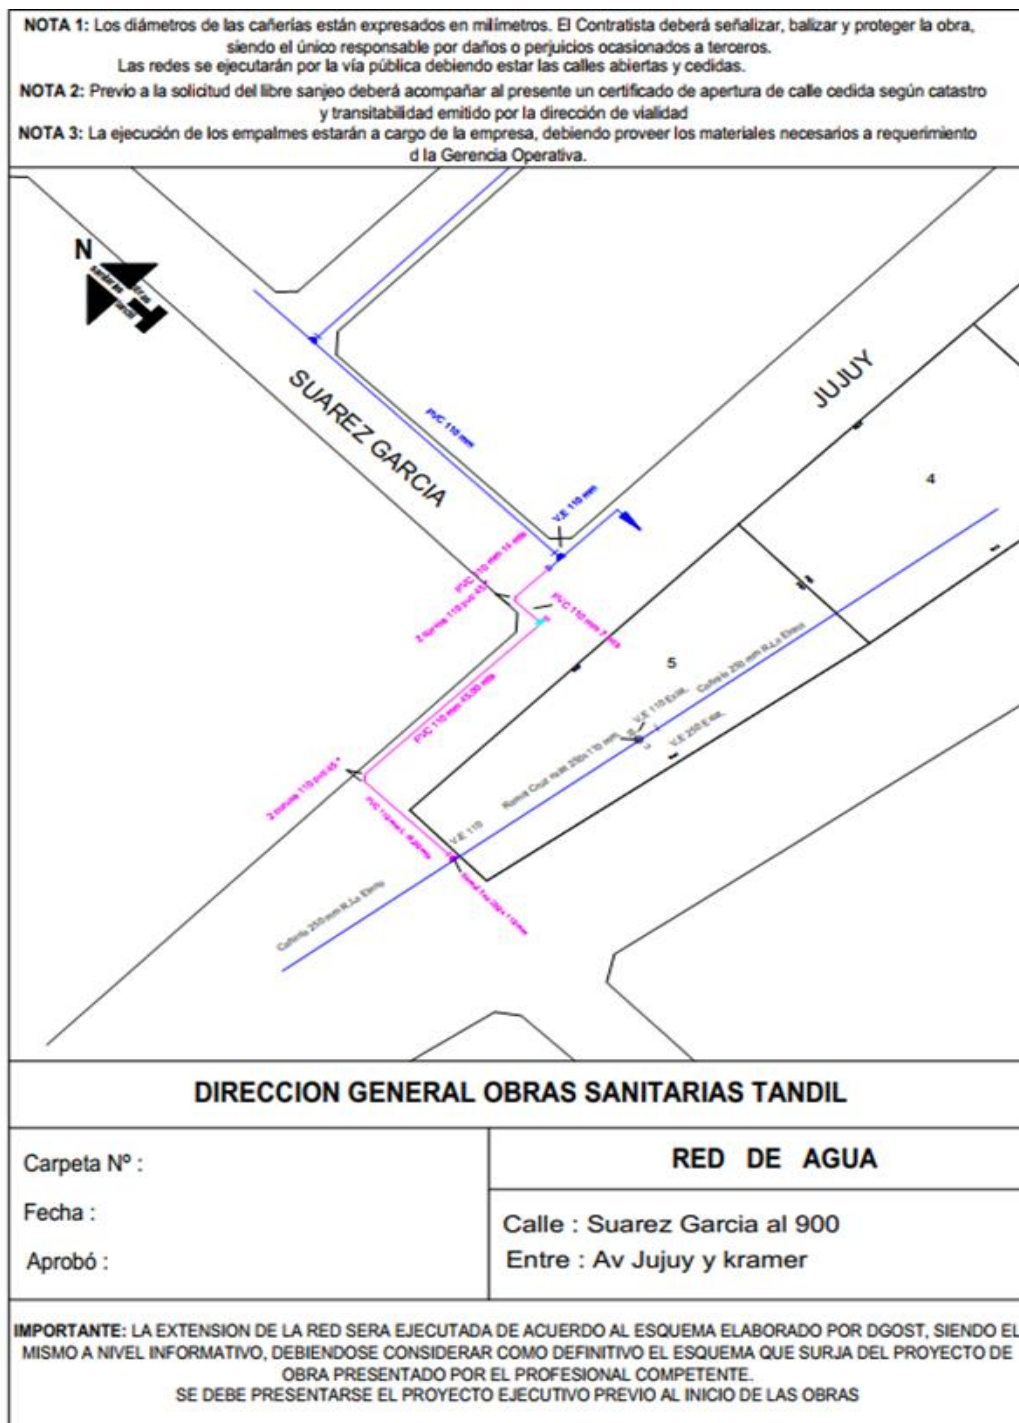

.....
Firma y aclaración oferente

.....
Firma y aclaración representante técnico


NOTA: Los diámetros de las cañerías están expresados en milímetros. El Contratista deberá señalizar, balizar y proteger la obra, siendo el único responsable por daños o perjuicios ocasionados a terceros.

Los empalmes a la red existentes deberán ser realizados por la contratista bajo la supervisión de gerencia operativa.

La contratista tiene prohibido manipular el cierre o apertura de válvulas existentes.

Las redes a extender se deben ejecutar por vereda. Se deberá verificar que las cañerías a empalmar se encuentren ejecutadas en vereda. Las calles deberán estar abiertas y cedidas al uso público.

Cualquier diferencia en obra por error u omisión por la falta de relevamiento de la contratista será a exclusivo cargo de la misma sin lugar a reclamo alguno.

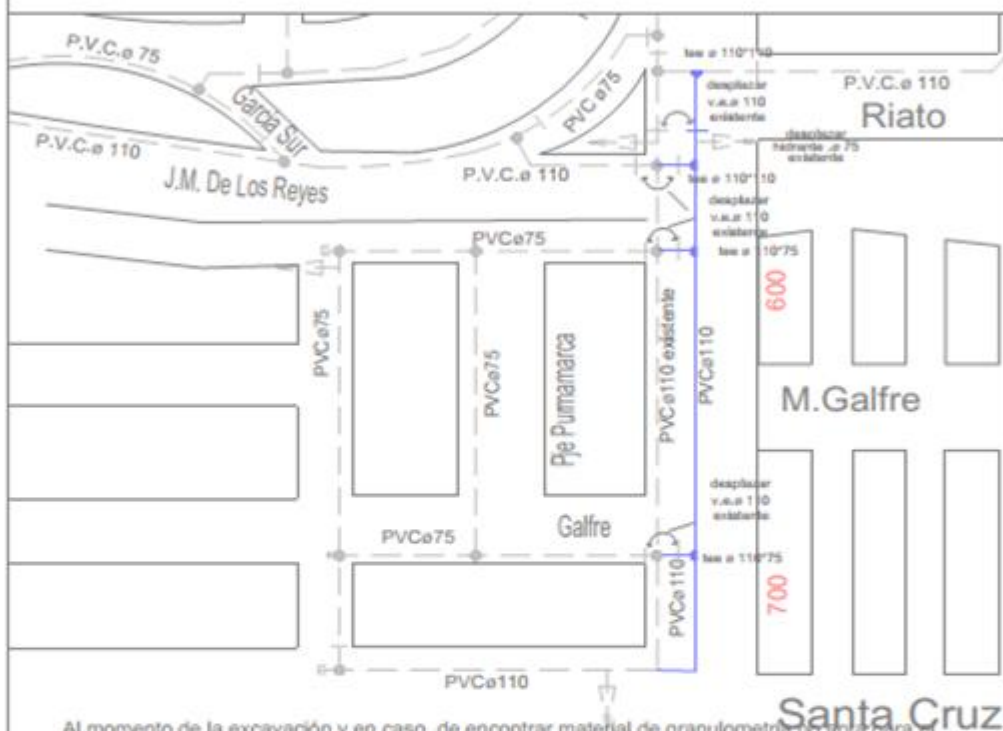

Al momento de la excavación y en caso de encontrar material de granulometría no apta para el relleno tapado y compactación de la cañería, el mismo deberá reemplazarse en todo el perfil por suelo seleccionado y de humedad óptima a fin de resguardar la cañería en su apoyo y tapado. La contratista deberá verificar los metros lineales de cañería a ejecutar conforme a su relevamiento hecho en obra.

DIRECCION GENERAL OBRAS SANITARIAS TANDIL

Carpeta N° : -	RED DE AGUA
Fecha : 22/07/2025 Aprobó :	Calle : JUJUY 600 -700 Entre : Santa Cruz y Riato
IMPORTANTE: LA EXTENSION DE LA RED SERA EJECUTADA DE ACUERDO AL ESQUEMA ELABORADO POR DGOST Y EL MISMO SE DEBERA ACTUALIZAR AL INICIO DE LAS OBRAS. DEBERA PRESENTARSE EL PROYECTO EJECUTIVO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.	



Municipalidad de Tandil
2026

Pliego Importado
Hoja Adicional de Firmas

Número:

Referencia: Pliego LPÚ 03-01 Extension de redes de agua y cloaca en diversas calles FOS
2025 - 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 86 pagina/s.
